


ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ



# ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6547030004

814004

МОНТАЖ ЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ИЗ ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ РАЗМЕРОМ (18+12)×60 м  
С КАРКАСОМ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ  
(ПРОЕКТ 236-01 В1)

МОСКВА-1991

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

ТИПОВАЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
6547030004  
814004


МОНТАЖ ЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ИЗ ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ РАЗМЕРОМ (18+12)×60 м  
С КАРКАСОМ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ  
(ПРОЕКТ 236-01 В1)


РАЗРАБОТАНА

Институтом Оргуралсибстрой

Главный инженер института

Начальник отдела ТСП-3

  
В.А.Шевков

  
И.А.Ершов

СОГЛАСОВАНО

управлением механизации и технологии  
строительства Госстроя СССР

Письмо от 13.12.1990г. № 12-348

Введена в действие с 1.06.1991г.

© ЦНИИОМТИ Госстроя СССР

МОСКВА-1991

## I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) разработана на монтаж двухпролётного здания многоцелевого назначения из лёгких металлических конструкций (ЛМК) комплектной поставки по проекту шифра 236-01В1, разработанному экспериментальным конструкторским бюро НПО "Совзстройконструкция" Минуралсибстроя РСФСР в 1985 г.

ТТК выполнена в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве" (М.: ЦНИИОМТП, 1987).

Типовая технологическая карта разработана на измеритель конечной продукции - одно здание.

Организация и технология работ разработана только на монтаж основных конструктивных элементов, затраты труда на все сопутствующие работы учтены в калькуляции.

ТТК предназначена для использования при составлении проекта производства работ (ППР) строительными подразделениями.

Привязка типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;
- проверка соответствия исходных данных (объёмов работ, марок механизмов и т.д.) принятому варианту;
- корректировка объёмов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;
- пересчёт калькуляции, оценочных технико-экономических показателей и потребности в материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.  
Краткая характеристика объёмно-планировочного и конструктивного решения здания:

здание одноэтажное, двухпролётное, с размерами в плане (18+12)х60 м; высота до низа несущих конструкций в 18-метровом пролёте равна 7,8 м, в 12-метровом пролёте - 7,665 м.

В 18-метровом пролёте предусмотрена установка мостового электрического крана грузоподъёмностью 5 т с управлением с пола.  
Отметка головки рельса - 6,7 м.

Здание со стальным каркасом, несущие конструкции - рамного типа из широкополочных двутавров, ригель рамы - с перфорированными стенками, прогоны и фахверк - из холодногнутых С-образных профилей.

Стены - из трехслойных стеновых панелей (ТУ 67-65I-84) с минераловатным утеплителем и профилированными металлическими обшивками.

Покрытие - из кровельных бескаркасных двухслойных панелей (ТУ 67-7I7-85) марки ПКМ-120 с утеплителем из минераловатных плит повышенной жёсткости.

Цоколь - из керамзитобетонных стеновых панелей серии I.432-I4/80.

Производство работ предусмотрено в летний и зимний периоды года.

				6547030004			
Ил. отг.	Ершов			Монтаж здания многоцелевого назначения из ЛМК комплектной поставки размером (18+12)х60 м	Стадия	Ил. т	Ил. в
Гл. техн.	Никифоров				I	55	
И. контр.	Неелова				Институт ОРГУРАЛСИБСТРОИ г. Челябинск		
Проверил	Ершов						
Разработал	Штерк						

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

### 2.1. Общие положения

В подготовительный период (до начала монтажа здания) необходимо выполнить следующие мероприятия:

принять по акту выполненные фундаменты с составлением исполнительной схемы;

привести стройплощадку в состояние, соответствующее стройгенплану;

обеспечить бригаду по перечню и в количестве, предусмотренном данной технологической картой, необходимым инструментом, инвентарем и приспособлениями.

Строительные материалы и конструкции доставляются на приобъектный склад специальным автотранспортом.

ТТК предусматривает монтаж конструкций с приобъектного склада. Схемы складирования конструкций приведены на листе 39.

Возведение здания (лист 14) необходимо начинать с устройства ячеи жесткости, которая расположена в центре здания (оси 5-6), поэтому здание возводится в четыре очереди (направление монтажа конструкций по каждой очереди: от ячеи жесткости к крайним осям).

В целях упрощения монтажных работ и обеспечения их безопасности часть конструкций укрупняется. Колонны и балки покрытия укрупнить в 18-метровом пролете в рамы, в 12-метровом пролете - в полурамы, панели покрытия - в картины.

Укрупнительную сборку и монтаж здания вести пневмоколесным краном КС-4361 (К-161) с длиной стрелы 20 м, грузоподъемностью 16 т, кроме того, возможны варианты применения других типов кранов с аналогичными техническими характеристиками.

Укрупнение рам выполнять по ходу их монтажа. Укрупнение картин покрытия производить до начала возведения здания, картины укладывать краном на площадке складирования вблизи мест монтажа.

Укрупнительную сборку картин выполнять с соблюдением следующих требований:

сборку картин покрытия выполнять на специально изготовленном шаблоне (лист 29), шаблон укладывать на спланированную площадку;

конструкции укладывать на шаблон в следующем порядке:

сначала уложить прогоны покрытия, закрепить их к шаблону, затем последовательно уложить на прогоны панели покрытия;

до укладки панелей на прогонах выполнить разметку, согласно таблице типоразмеров картин (листы 27,28).

разметку под самонарезающие винты производить согласно рабочим чертежам.

Вырезку и извлечение теплоизоляционных слоёв в местах установки самонарезающих винтов выполнять сверлильной машиной со специальной насадкой. Установку винтов производить гайковертом, комбинированных заклёпок - пистолетом ручной односторонней клёпки.

Варианты рекомендуемых машин и оборудования для монтажа приводятся в табл.1.

Таблица 1

Наименование комплекта машин и оборудования	Вариант (фасет-код)	Техническая характеристика	М а р к а	Количество
Кран монтажный	1 (02-1)	Кран пневмоколесный грузоподъемностью 16т	КС-4361 (К-161)	1
	2 (02-2)	Кран автомобильный грузоподъемностью 16 т	МТА-160-К	1
	3 (02-3)	Кран гусеничный грузоподъемностью 25 т	МКГ-25.1	1
	4 (02-4)	Кран пневмоколесный грузоподъемностью 25т	МКМ-25А	1
Транспортные средства	1	Полуприцеп-панелевоз грузоподъемностью 12 т	УПИ-1207 МАЗ-504В	1
	1	Тягач	МАЗ-504В	1
	2	Полуприцеп-панелевоз грузоподъемностью 12т	ПИ-1207	1
	2	Тягач	УПЛ-1412	1

Продолжение табл. I

Наименование комплекта машин и оборудования	Вариант (фасет-код)	Техническая характеристика	М а р к а	Количество
Оборудование для рабочего места монтажника	I (OI-1)	Передвижные подмости	ЦНИИОМТП пр.44OI.00.000	I
	I (OI-3)	Приставные лестницы	Л-I ЛА-4	2 2
	2 (OI-3)	То же	Л-I	2
	2 (OI-2)		ЛА-4	2
	3 (OI-2)	Автоподъемник	АП-I7	I
	--	АП-I7	I	

В ТТК разработаны три варианта организации работ по монтажу здания в зависимости от применяемых средств подмащивания.

I вариант предусматривает использование при установке рам каркаса и подкрановых балок приставных лестниц, для монтажа стенового ограждения и панелей покрытия - подмостей ЦНИИОМТП и приставных лестниц.

Монтаж конструкций здания выполнять комплексным методом (ячейками). Размер ячейки 6x18 и 6x12 м.

Выбор метода монтажа ячейками сделан из расчёта наименьшего числа перестановок средств подмащивания, т.к. при одной их установке монтируются несколько конструкций в пределах ячейки.

В данной ТТК I вариант принимается за базовый. Схема монтажа здания для I варианта приведена на листе I4.

II вариант предусматривает использование приставных лестниц при установке рам каркаса, подкрановых балок и панелей покрытия; для монтажа стенового ограждения используются автоподъемники АП-I7.

Монтаж конструкций здания ведётся комбинированным (смешанным) методом в два этапа:

I-й этап - монтаж рам каркаса, подкрановых балок (в I8-метро-

вом пролёте) и панелей покрытия ячейками (комплексный метод);

2-й этап - монтаж стенового ограждения отдельным потоком.

Монтаж конструкций на I-м этапе выполнять краном грузоподъёмностью I6 т (марку крана выбирать согласно табл. I).

Стеновые ограждения на 2-м этапе монтировать автомобильным краном КС-3562А грузоподъёмностью I0 т, с длиной стрелы I4 м.

Комбинированный метод монтажа конструкций здания позволит уменьшить время нахождения автоподъемников АП-I7 на монтаже здания (листы 34,36).

III вариант предусматривает использование автоподъемников АП-I7 при монтаже всех конструктивных элементов здания.

Монтаж конструкций здания ведётся комплексным методом (ячейками), т.к. при этом методе уменьшается количество перемещений крана и автоподъемников (лист 37).

Для всех вариантов предусматривается свободный метод монтажа элементов с последующей их выверкой.

Строповку всех конструкций выполнять стропами из стальных канатов, схемы строповки приведены на листах 30-32.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить устойчивость и неизменяемость смонтированной части здания, устойчивость монтируемых конструкций на всех стадиях монтажа.

Работы по монтажу здания производить комплексной бригадой монтажников, владеющих смежной профессией. Состав бригады приводится в табл.2. Монтаж конструктивных элементов здания выполнять специализированными звеньями монтажников; состав звеньев приводится в графике производства работ (табл.7).

Таблица 2

Профессия членов бригады		Р а з р я д				Кол-во
Основная	Смежная	UI	У	IУ	Ш	
Монтажник	-	I	-	-	-	I
Монтажник	Сварщик	-	I	-	-	I
Монтажник	Изолировщик	-	-	I	-	I
Монтажник	Такелажник	-	-	I	I	2
Монтажник	Такелажник	-	-	I	I	2
Электросварщик	Монтажник	-	I	-	-	I
Итого:		I	2	3	I	8

Машинисты грузоподъемных кранов и автомобильных подъемников в состав комплексной бригады не включаются.

Монтажников, не участвующих в монтаже конструкций, необходимо занять на сопутствующих работах.

2.2. Технологическая последовательность выполнения работ на ячейке в 18-метровом пролете:

- укрупнительная сборка первой рамы каркаса;
- монтаж первой рамы каркаса;
- укрупнительная сборка второй рамы каркаса;
- монтаж второй рамы каркаса;
- монтаж связей по колоннам (в ячейках жесткости);
- монтаж подкрановых балок;
- монтаж элементов стенового ограждения;
- монтаж конструкций покрытия.

Укрупнительная сборка первой рамы каркаса

Укрупнительную сборку колонн и балок покрытия в рамы выполнять на строительной площадке в зоне действия стрелы крана. Конструкции для укрупнительной сборки укладывать на подкладки из деревянных шпал.

Перед сборкой рамы необходимо: подготовить укрупняемые колонны и балки покрытия; проверить соответствие геометрических размеров укрупняемых элементов допускам; стыкуемые поверхности очистить от грязи, ржавчины, снега, льда, масла и пыли. Кроме того, необходимо спилить напильником или срубить зубилом заусенцы на кромках деталей и отверстий; проверить соответствие допускам диаметров отверстий.

Сборку рамы производить в два этапа:

1-й этап - на подкладки из шпал уложить колонны и балки покрытия и собрать две полурамы, установив болты без окончательной затяжки;

2-й этап - полурамы соединить между собой в коньковом узле болтами, произвести замеры линейных размеров рамы и выполнить окончательную затяжку всех болтов рамы.

Укрупнительную сборку всех последующих рам каркаса выполнять согласно требованиям, изложенным для первой рамы каркаса.

Последовательность выполнения болтовых соединений узлов рамы: совместить с помощью проходных оправок все отверстия стыка; установить пробки;

установить болты по проекту.

При этом необходимо соблюдать следующие требования:

проходные оправки забивать во все отверстия с помощью кувалды, коническая часть оправки должна упираться в кромки отверстий, которые по мере перемещения оправки вглубь пакета совместятся.

Для фиксации взаимного расположения соединяемых элементов и предупреждения их сдвига часть отверстий (не менее 10 %) должна заполниться пробками. После установки пробок все оправки выбить.

Стяжку соединяемых элементов производить установкой постоянных болтов. Головки и гайки болтов должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб. Резьба болта должна находиться вне тела пакета соединяемых элементов, а гладкая часть его стержня не должна выступать из шайбы. Гайки и контргайки следует закручивать до отказа, от середины соединения к его краям.

Монтаж первой рамы каркаса

Подъем рамы из горизонтального положения выполнять методом поворота рамы вокруг подвижного шарнира (скольжением).

Работы выполнять в два этапа:

1-й этап - приподнять раму за вершину (без отрыва опорной части колонн от земли), уменьшая вылет стрелы крана до минимального;

2-й этап - привести раму в вертикальное положение, поднимая крюк крана; при этом опорные части колонн рамы должны скользить по направляющим.

До подъема рамы необходимо:

приварить опорные уголки под стеновые прогоны;

на базы колонн надеть опорные приспособления (лист 17);

под колонны на участке скольжения уложить на землю направляющие из швеллера 12 и покрыть их смазкой.

До подъема рамы необходимо нанести осевые риски масляной краской в двух уровнях по высоте колонн:

на вертикальные грани опорных плит колонн и на оголовки колонн по двум смежным граням;

на консолях колонн нанести осевые риски для укладки подкрановых балок.

Установку рамы на фундаменты производить на стальные подкладки, которые выполняют из обрезков листовой стали и укладывают на фундаменты по краям опорной плиты колонны с двух противоположных сторон (с двух других сторон забить инвентарные клинья).

Требуемую толщину подкладок подбирать по каждому фундаменту, используя данные исполнительной съёмки фундаментов и измерений длин колонн.

Установку монтируемой рамы в проектное положение производить, совмещая осевые риски на опорных плитах колонн с осевыми рисками, нанесенными на верхней поверхности фундамента.

Для предохранения резьбы анкерных болтов от повреждения необходимо до монтажа рамы надеть на них стальные предохранительные колпаки, изготавливаемые из обрезков газовых труб.

Вертикальность установки рамы в продольной и поперечной плоскостях проверять с помощью двух теодолитов, установленных в створах продольной и поперечной разбивочных осей, совмещая положение нижних и верхних рисков на колоннах с вертикальной визирной осью теодолита.

В продольной плоскости вертикальность рамы достигают изменением толщины подкладок под опорными плитами колонн. Для этого необходимо приподнять раму краном, вынуть подкладки, изменить их толщину и уложить на прежнее место. Убедившись в вертикальности установленной рамы, подкладки, собранные в пакет, соединить от сдвига электросваркой.

После установки рамы в продольной плоскости необходимо временно ее раскрепить. Временное крепление рамы выполнять расчалками из стального каната, в количестве 4 шт. на раму. Верхний конец расчалки крепить к колонне рамы, а нижний – за фундаменты (на анкерные болты фундаментов установить анкера). Расчалки снабжены винтовыми стяжками (талрепами) для выверки рамы в вертикальной плоскости.

Расстроповку рамы выполнять только после временного её закрепления. Расчалки снимать после монтажа вертикальных связей связевой ячейки.

Вертикальность рамы в поперечной плоскости достигают наклоном её в нужную сторону, регулируя длину расчалок с помощью талрепов.

После приведения рамы в проектное положение затянуть гайки

анкерных болтов и подлить цементный раствор под опорные плиты колонн.

Схема монтажа первой рамы каркаса приведена на листе 16.

#### Монтаж второй рамы каркаса

В продольном направлении раму устанавливать аналогично указаниям, изложенным для первой рамы.

Временное крепление рамы после установки её в продольной плоскости выполнять инвентарной распоркой, которую до монтажа рамы крепить струбциной к балке покрытия в середине пролёта.

При установке рамы распорку перевести из вертикального положения в горизонтальное с помощью оттяжки из бельного каната и закрепить струбциной к первой раме каркаса. Подъём и закрепление распорки производить с приставной лестницы с площадкой, установленной у первой рамы.

После временного закрепления рамы выполнить её расстроповку и выверку в поперечной плоскости.

Вертикальность рамы в поперечной плоскости достигают наклоном её в нужную сторону, регулируя длину распорки с помощью фаркофа. Распорку снимают после монтажа картины покрытия.

Монтаж всех последующих рам выполнять согласно требованиям, изложенным для монтажа второй рамы.

Схема монтажа второй рамы каркаса показана на листе 20.

#### Монтаж вертикальных связей по колоннам

Монтаж вертикальных связей по колоннам в ячейке жесткости следует выполнять перед монтажом подкрановых балок.

Установку вертикальных связей производить с передвижных площадок, монтаж выполнять поэтапно, без укрупнения.

#### Монтаж подкрановых балок

Монтаж подкрановых балок производить без тормозных площадок, последние монтировать после укладки и закрепления подкрановых балок.

В качестве средств подмащивания при монтаже подкрановых балок и тормозных площадок использовать приставные лестницы. Выверку подкрановых балок выполнять с передвижных подмостей конструкции ЦНИИОМТП.

При установке подкрановых балок необходимо руководствоваться следующими требованиями:

до подъёма подкрановой балки нанести осевые риски на опорное ребро балки, к балке закрепить оттяжки из бельного каната;

установку балки в проектное положение производить, совмещая осевые риски на опорном ребре балки с осевыми рисками на консолях колонн;

временное крепление подкрановой балки выполнять болтами, болты не закручивать до отказа (вначале закрепить нижний пояс балки, затем состыковать балку со смонтированной ранее, в последнюю очередь выполнить крепление верхнего пояса балки к колонне);

расстроповку балки производить после временного закрепления нижнего пояса балки.

Подкрановые рельсы длиной 12 м подавать краном под покрытие ячейки, смежной с монтируемой, до монтажа панелей покрытия в монтируемой ячейке. Рельсы временно укладывать на элементы крепления верхнего пояса подкрановой балки к колонне и устанавливать в проектное положение монтажными ломиками после выверки подкрановых балок.

Выверку смонтированных подкрановых балок производить по окончании монтажа и временного закрепления всех подкрановых балок в пролёте здания.

Перед выверкой произвести геодезическую съёмку подкрановых балок с составлением исполнительной схемы, на которой необходимо указать:

- расстояние между осями подкрановых балок;
- отклонение оси подкрановой балки от оси подкранового пути;
- отметки подкрановых балок на опорах и в середине балки;
- размеры от оси подкрановой балки до грани колонны.

Балку устанавливать на проектную отметку путём забивки стальных клиньев между опорной поверхностью консоли колонны и нижним поясом подкрановой балки. Затем под опорное ребро балки уложить монтажную стальную подкладку, которую потом приварить к консоли колонны. Толщину монтажных подкладок подбирать, руководствуясь данными исполнительной съёмки.

Выверку подкрановой балки в плане выполнять монтажными ломиками.

После выверки подкрановые балки закрепить по проекту, затянув гайки монтажных болтов до отказа.

Схема монтажа подкрановых балок приведена на листе 22.

#### Монтаж элементов стенового ограждения

При монтаже элементов стенового ограждения средства подмащивания устанавливать снаружи и изнутри здания.

Снаружи здания для подмащивания использовать передвижные площадки конструкции ЦНИИОМТП.

Крепление стеновых панелей изнутри здания на отм. 8,170 выполнять с лестниц с монтажными площадками; лестницы закреплять за прогоны покрытия здания (прогоны монтировать одновременно с монтажом стенового ригеля на отм. 8,170).

Подъём на лестницы производить с подкрановых балок. Для выхода на подкрановые балки использовать приставные лестницы.

При монтаже элементов стенового ограждения необходимо руководствоваться следующими требованиями:

до монтажа стеновых панелей должны быть смонтированы цокольные стеновые панели и стеновые ригели в пределах ячейки;

до подъёма стеновой панели проверить ее основные размеры, правильность и надёжность установки пластин для крепления панели, закрепить по торцам панели полосы из минераловатной плиты;

установку панели производить на опорные ригели;

устанавливаемая панель должна плотно прилегать к ранее смонтированной;

установку и временное крепление панели в нижнем и верхнем узлах выполнять, закрепляя панели крепежными болтами к ригелю согласно рабочим чертежам, при этом гайки болтов не закручивать до отказа для обеспечения подвижности панели при выверке;

расстроповку панели производить только после временного ее крепления;

вертикальность панели проверять по отвесу, выверку выполнять монтажными ломиками при ослабленном натяжении крепежных болтов; после выверки вертикальности гайки болтов затянуть.

Схема монтажа элементов стенового ограждения показана на листе 23.

#### Монтаж конструкций покрытия

Направление работ по монтажу конструкций покрытия предусмотрено от продольных осей пролёта к коньку кровли.

Крепление элементов покрытия выполнять с приставных лестниц с



площадками и смонтированного покрытия.

Для подъёма рабочих на покрытие использовать приставные лестницы.

При монтаже конструкций покрытия необходимо руководствоваться следующими требованиями:

панели покрытия длиной 6,1 м до начала монтажа укрупнить в картины;

конструкции покрытия в коньковой части здания монтировать поэлементно, сначала смонтировать прогоны покрытия, затем - панели; покрытие в коньковой части здания выполнять после монтажа картин покрытия ячейки;

строповку картин и панелей покрытия выполнять четырехветвевыми стропами с помощью специальных захватов (лист 31);

укладку картин покрытия на балки выполнять, совмещая отверстия в прогонах картины с отверстиями на крепежных уголках балки покрытия, точность укладки картины регулировать путём рихтовки ее монтировками при натянутых стропях;

после монтажа картин покрытия в двух смежных ячейках в проём между картинами уложить доборную панель;

ширину проёма, необходимую для укладки доборной панели, контролировать до крепления картины с помощью шаблона из профилированного листа;

шаблон укладывать на смежные картины в местах опирания прогонов.

Схема монтажа покрытия ячейки показана на листах 25,26.

Технологическая последовательность выполнения работ на ячейке в 12-метровом пролёте:

- укрупнительная сборка первой полурамы каркаса;
- монтаж первой полурамы каркаса;
- укрупнительная сборка второй полурамы каркаса;
- монтаж второй полурамы каркаса;
- монтаж связей по колоннам (в ячейках жёсткости);
- монтаж распорок;
- монтаж элементов стенового ограждения;
- монтаж конструкций покрытия.

#### Укрупнительная сборка первой полурамы каркаса

Укрупнительную сборку колонн и балок покрытия в полурамы выполнять на строительной площадке в зоне действия стрелы крана. Конструкции для укрупнительной сборки укладывать горизонтально на подкладки из деревянных шпал.

Сборку полурамы производить в два этапа:

1-й этап - на подкладки из шпал уложить колонну и балку, собрать полураму, установив болты без окончательной затяжки;

2-й этап - измерить основные линейные размеры полурамы, затем произвести окончательную затяжку гаек крепежных болтов.

Укрупнительную сборку всех последующих полурам каркаса выполнять согласно требованиям, изложенным для первой полурамы каркаса.

Последовательность выполнения болтовых соединений и основные требования к их выполнению приведены на листе 4.

#### Монтаж первой полурамы каркаса

Подъём полурамы из горизонтального положения выполнять методом поворота ее вокруг подвижного шарнира без отрыва опорной части колонны от земли. Полураму при подъёме застропить за балку покрытия согласно схеме строповки (лист 30), подъём производить уменьшая вылет стрелы крана.

До подъёма полурамы приварить опорные уголки под стеновые прогоны, а на базу колонны надеть опорное приспособление (лист 16).

Временное крепление полурамы выполнять расчалками из стального каната, в количестве 2 шт. на полураму. Верхний конец расчалки крепить к колонне полурамы, а нижний - за фундаменты (на болты фундаментов установить анкер).

Расчалки снабжены винтовыми стяжками (талрепами) для выверки полурамы.

Монтаж полурамы выполнять в три этапа:

1-й этап - установка полурамы на фундамент и одновременное совмещение отверстий в узле стыковки с рамой смежного 18-метрового пролёта;

2-й этап - установка и закрепление болтов в узле стыковки, согласно рабочим чертежам;

3-й этап - выверка вертикальности полурамы и закрепление основания

согласно рабочим чертежам.

При установке первой полурамы необходимо руководствоваться следующими требованиями:

до подъёма полурамы нанести осевые риски и закрепить на базе колонны опорное приспособление;

осевые риски наносить в двух уровнях по высоте колонны: на вертикальную наружную грань опорной плиты колонны и на оголовок колонны по наружной её грани;

установку полурамы на фундамент производить на стальные подкладки;

совмещение отверстий в узле стыковки полурамы с рамой 18-метрового пролёта производить с изменением толщин стальных подкладок под опорной плитой колонны, при необходимости подкладки собирать в пакет, соединив их от сдвига электросваркой;

совмещение отверстий выполнять при натянутых стропях крана; последовательность и основные требования к выполнению болтовых соединений приведены на листе 4;

после установки болтов в стыке с рамой полураму временно раскрепить расчалками, после чего расстропить;

вертикальность установки полурамы в поперечной плоскости проверять с помощью теодолита, установленного в створе поперечной разбивочной оси, совмещая положение нижних и верхних рисков на колонне с вертикальной визирной осью теодолита;

выверку вертикальности установленной полурамы производить, регулируя натяжение расчалок с помощью талрепов;

расчалки снимать после монтажа вертикальных связей связевой ячейки.

После приведения полурамы в проектное положение затянуть гайки анкерных болтов и подлить цементный раствор под опорную плиту колонны.

Стыковку полурамы с рамой смежного пролёта выполнять с передвижных подмостей конструкции ЦНИИОМТП.

Схема монтажа первой полурамы приведена на листе 16.

#### Монтаж второй полурамы каркаса

При монтаже второй полурамы каркаса необходимо руководствоваться требованиями, приведенными для монтажа первой полурамы каркаса.

Временное крепление второй полурамы выполнять инвентарной распоркой, которую до монтажа полурамы крепить струбицей к балке покрытия в середине пролёта.

Выверку вертикальности полурамы в поперечной плоскости выполнять с помощью фаркопфов распорок. Распорку снимать после монтажа картины покрытия.

Монтаж всех последующих полурам выполнять согласно требованиям, изложенным для монтажа второй полурамы.

Схема монтажа второй полурамы каркаса показана на листе 20.

#### Монтаж связей по колоннам (в ячейке жесткости)

Монтаж связей по колоннам в ячейке жесткости выполнять после монтажа двух полурам.

Установку связей (вертикальных и горизонтальных) осуществлять с передвижных площадок конструкции ЦНИИОМТП, монтаж производить краном поэлементно без укрупнения.

#### Монтаж распорок

Монтаж распорок между колоннами выполнять после монтажа двух полурам.

В качестве средств подмащивания использовать передвижные площадки конструкции ЦНИИОМТП.

### Монтаж элементов стенового ограждения

При монтаже элементов стенового ограждения в качестве средств подмащивания использовать передвижные площадки конструкции ЦНИИОМТП, которые устанавливать снаружи и изнутри здания.

Основные требования, которыми необходимо руководствоваться при монтаже элементов стенового ограждения, приведены на листе 6.

Схема монтажа элементов стенового ограждения показана на листе 23.

### Монтаж конструкций покрытия

Направление работ по монтажу конструкций покрытия предусмотрено от карниза кровли к смонтированному смежному пролёту.

Панели покрытия до начала монтажа укрупнить в картины.

При монтаже конструкций покрытия необходимо руководствоваться требованиями, приведенными для монтажа конструкций покрытия в 18-метровом пролёте.

Схема монтажа покрытия ячейки показана на листе 25.

## 2.3. Геодезическое обеспечение

Все геодезические работы на стройплощадке выполнять в соответствии со СНиП 3.01.03-84 и ГОСТ 21779-82.

Инженерно-геодезические работы предшествуют процессу строительства, сопутствуют ему и завершают его.

Их можно разбить на следующие стадии:

создание планово-высотного обоснования;

вынос в натуру и закрепление основных осей;

детальные разбивочные работы при выполнении нулевого цикла;

детальные разбивочные работы при возведении надземной части;

исполнительная съёмка геометрического положения смонтированных конструкций с составлением исполнительных схем.

Вынос разбивочных осей на все фундаменты выполнять от основных осей с помощью теодолита и рулетки и закреплять на поверхности бетона фундамента краской.

На все фундаменты, сдаваемые под монтаж металлических конструкций, должна составляться исполнительная схема, на которой указываются:

проектные и фактические расстояния между осями;  
проектные и фактические отметки верха бетона;  
проектные и фактические отметки верха анкерных болтов.

После выверки и проектного закрепления каркаса здания производится исполнительная съёмка положения смонтированных конструкций.

На исполнительной съёмке указать:

смещение осей колонн в нижнем сечении относительно разбивочных осей;

отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении;

отметки опорных поверхностей подкрановых балок.

Исполнительные схемы прилагать к акту на приёмку сооружения для последующих строительных работ.

#### 2.4. Указания по производству работ в зимнее время

Конструкции подавать на монтаж очищенными от снега, наледи и грязи. Особенно тщательно защищать от увлажнения и наледи стыкуемые поверхности элементов. При необходимости наледь удалять не только скребками и щетками, но и прогревая обледеневшие места до полного исчезновения следов наледи. Для прогрева применять газовые и другие горелки. Пользоваться горячей водой запрещается.

При отрицательных температурах сварочные работы необходимо выполнять с соблюдением следующих рекомендаций:

- особо тщательно заваривать кратеры и замыкающие участки швов;
- удалить влагу и снег на расстоянии не менее 0,8-1 м от места сварки и зачищать от ржавчины прилегающие к шву участки на ширину 20 мм;

- предварительно просушивать зону сварки с помощью горелок и других источников нагрева;

- тщательно выполнять прихватки и проверять отсутствие в них непроваров и трещин. При сильных морозах (температуре ниже минус 30°C) прихватки заменять сплошными швами;

- использовать теплые после прокалки электроды;
- дефектные участки швов удалять без приложения ударных нагрузок;

- обеспечивать сварщиков теплой спецодеждой и обувью;
- свариваемые поверхности и рабочие места сварщиков защищать от снега, дождя, сильного ветра и сквозняков.

Не разрешается производить электросварочные работы при температуре ниже минус 30°C для сталей класса АІ и температуре ниже минус 20°C для сталей класса АІІ.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Порядок и организацию работ по контролю качества строительномонтажных работ (СМР) устанавливает ОСТ 36-125-85.

При производстве СМР контроль необходимо осуществлять в следующем порядке:

- входной контроль документации;
- приёмочный контроль площадок, зданий, сооружений и конструкций для производства СМР;
- входной контроль материалов;
- операционный контроль;
- приёмочный контроль;
- инспекционный контроль.

В данный раздел ТТК включены элементы операционного контроля качества основных технологических процессов (табл.3).

Операционный контроль выполняется производителями работ и мастерами. К проведению операционного контроля могут быть привлечены строительные (сварочные) лаборатории и геодезические службы.

Операционному контролю предшествует самоконтроль исполнителей, бригадиров, звеньевых и рабочих, обязанных обеспечивать качество выполняемых ими операций.

Основными рабочими документами при операционном контроле качества являются схемы операционного контроля качества, разрабатываемые в составе ППР, строительные нормы и правила.

Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ и учитываются при определении оценки качества работ.

При приёмочном контроле производят проверку и оценку качества выполненных СМР, а также ответственных конструкций. Правила приемки регламентирует СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

Приёмочный контроль смонтированных конструкций осуществляют согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

При приемке смонтированных конструкций предъявляют следующие документы:

- рабочие чертежи смонтированных конструкций с указанием на них всех отклонений от требований проекта, допущенных в процессе монтажа и согласованных с проектными организациями;
- паспорта на монтируемые конструкции или их элементы, а также

сертификаты на материалы, примененные при монтаже и сварке; исполнительные схемы геодезической проверки положения конструкций;

- журналы монтажных, сварочных работ и заделки стыков;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- документация лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков;
- опись удостоверений сварщиков, работающих при монтаже конструкций.

Таблица 3





Наименование процессов, подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролёр	Технические критерии оценки качества
Приёмка фундаментов для установки рам каркаса	Соответствие выполненных фундаментов рабочим чертежам	Нивелир, рулетка	В процессе работ и по их окончании	Мастер	Отклонения отметок опорных поверхностей фундаментов от проектных - 5 мм Разность отметок опорных поверхностей соседних фундаментов по ряду и в пролёте - 3 мм Смещение осей фундаментов относительно разбивочных осей - 5 мм Смещение анкерных болтов в плане - 5 мм
Укрупнительная сборка рам каркаса	Точность сборки	Рулетка, визуально	В ходе и по окончании укрупнительной сборки	-"-	Отклонения линейных размеров - 8 мм Отклонения равенства диагоналей - 20 мм
Монтаж рам каркаса	Точность установки	Рулетка, теодолит, линейка измерительная	В процессе монтажа	-"-	Отклонения отметок опорных поверхностей колонн от проектных - 5 мм Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн по ряду и в пролёте - 3 мм Смещение осей колонн относительно разбивочных осей в опорном сечении - 5 мм Отклонения осей колонн от вертикали в верхнем сечении - 10 мм
Монтаж подкрановых балок и рельсов	То же	Рулетка, нивелир, линейка измерительная	То же	-"-	Смещение оси подкрановой балки с продольной разбивочной оси - 5 мм Смещение опорного ребра балки с оси колонны - 20 мм Смещение оси рельса с оси подкрановой балки - 15 мм Отклонение оси рельса от прямой на длине 40 м - 15 мм Разность отметок головок рельсов в одном поперечном разрезе пролёта здания, мм: на опорах - 15 в пролёте - 20 Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах - 10 мм Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте - 2 мм
Укрупнительная сборка кровельных панелей в картины	Точность сборки, соответствие размеров картины рабочим чертежам	Рулетка, визуально	В процессе работ и по их окончании	-"-	Отклонения линейных размеров - 8 мм Отклонения равенства диагоналей - 20 мм

Продолжение табл.3

Наименование процессов, подлежащих контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Время контроля	Ответственный контролёр	Технические критерии оценки качества
Монтаж кровельных панелей	Точность установки	Рулетка, шаблон из листа профнастила, визуально	В процессе монтажа	Мастер	Отклонение длины опирания панели на прогоны в местах поперечных стыков - 5 мм Отклонение положения центров: самонарезающих болтов - 5 мм; комбинированных заклёпок: вдоль настила - 20 мм; поперек настила - 5 мм
Монтаж стеновых панелей	То же	Отвес, рулетка, линейка измерительная, визуально	То же	-"-	Отклонение от вертикали продольных кромок панелей: 0,001L мм, где L - длина панели Отклонение плоскости наружной поверхности стенового ограждения от вертикали - 0,002H, где H - высота ограждения
Постановка болтов в монтажных стыках	Проверка плотности стяжки и качества затяжки собранного узла	Гайковёрт, шуп, молоток, визуально	В процессе работ и по их окончании	-"-	В собранном узле болты заданного в проекте диаметра должны пройти в 100 % отверстий. Допускается прочистка 20 % отверстий сверлом, диаметр которого равен диаметру отверстия, указанному в чертежах Плотность стяжки собранного узла надлежит проверять шупом толщиной 0,3 мм, который в пределах зоны, ограниченной шайбой, не должен проходить между собранными деталями на глубину более 20 мм. Качество затяжки постоянных болтов следует проверять обстукиванием их молотком массой 0,4 кг, при этом болты не должны смещаться
Сварочные работы	Контроль сварных соединений в процессе их выполнения, соответствие проекту марки электродов	Линейка измерительная, визуально	В процессе монтажа	-"-	Поверхность шва должна быть равномерно-чешуйчатая, без прожогов, наплывов, сужений и перерывов Глубина подрезов - до 5 % толщины свариваемого проката, но не более 1 мм Дефекты (непровары, цепочки и скопления пор), соседние по длине шва: расстояние между близлежащими концами - не менее 200 мм

1-1


2-2

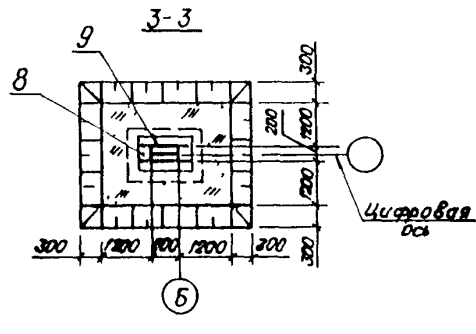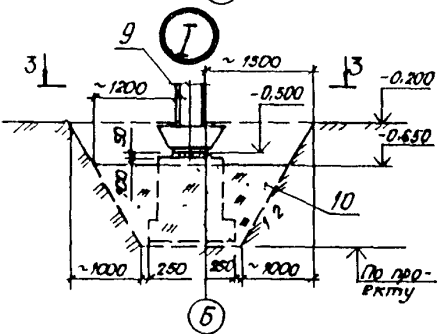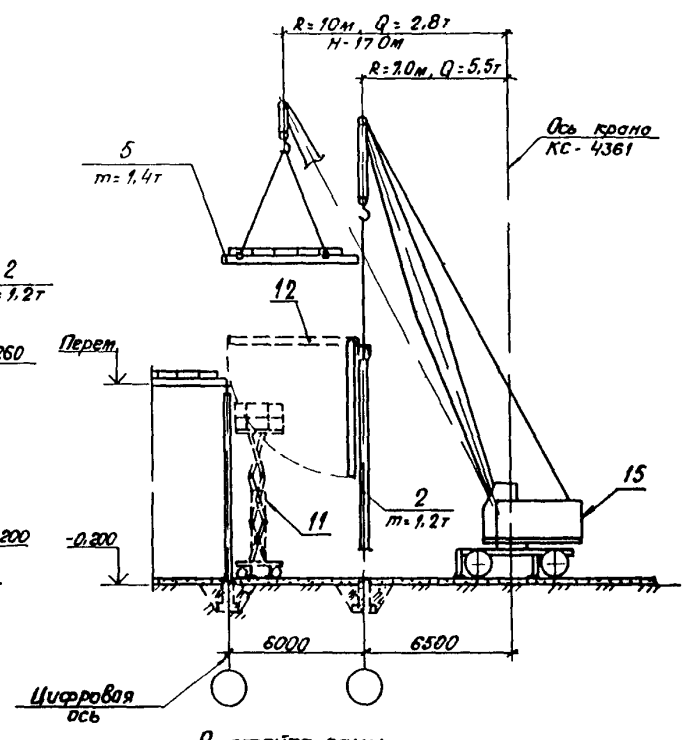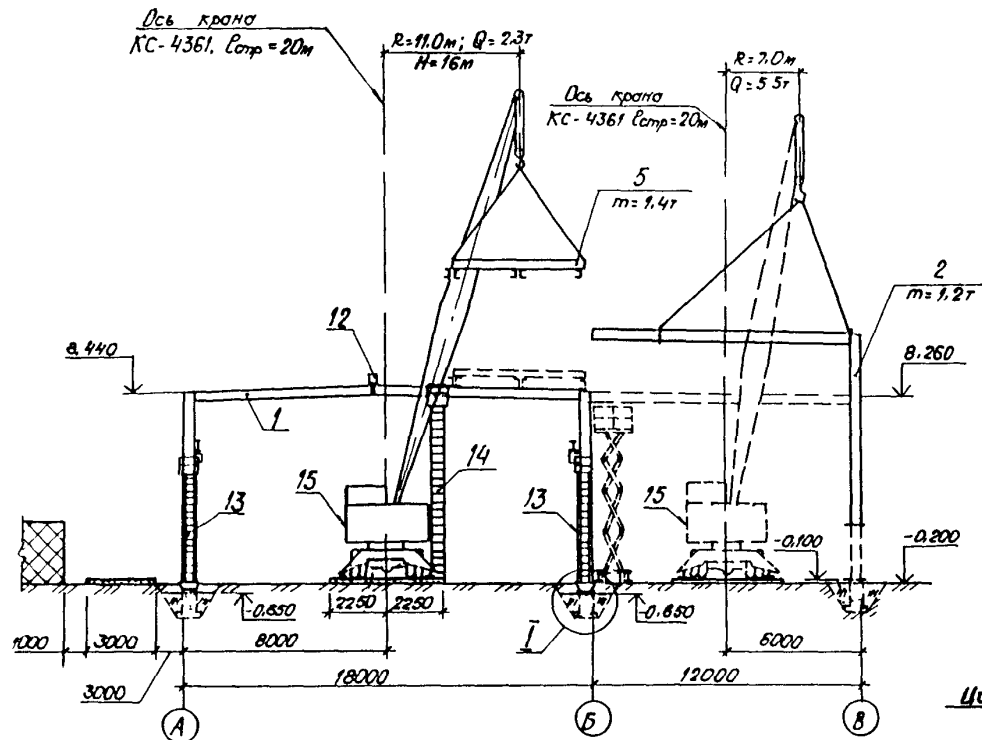

- 9- стойка рамы,
  - 10- обратная засылка,
  - 11- подмости ЦНИИОМТП,
  - 12- временная распорка;
  - 13- приставная лестница А-1;
  - 14- приставная лестница АА-4,
  - 15- кран КС-4361
- 1 Данный лист смотреть совместно с л 14  
 2 Пунктиром показано проектное положение конструкции



Схема монтажа конструкции здания

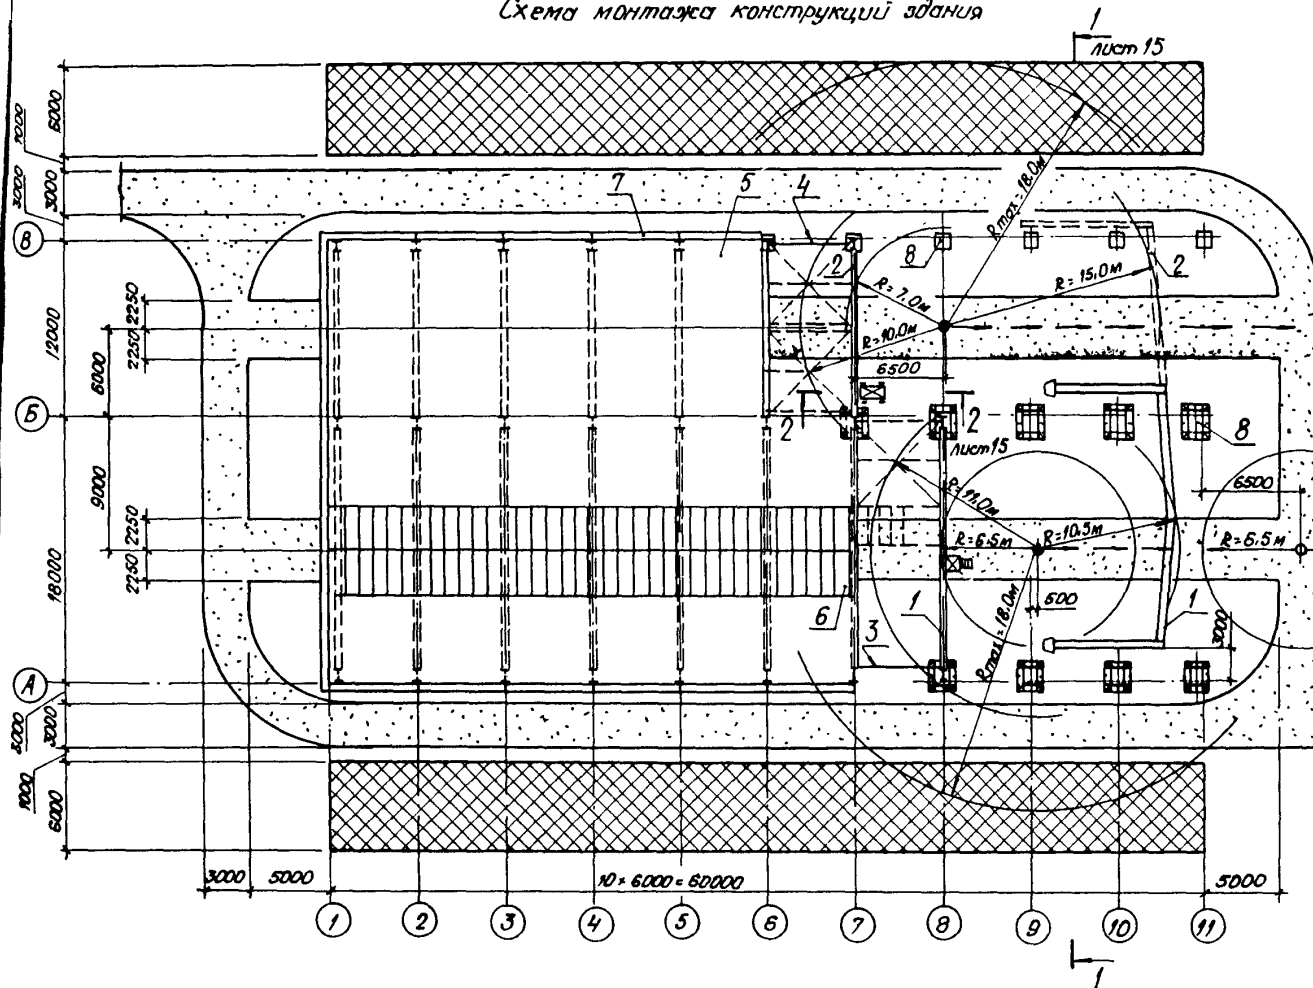


Условные обозначения




- временные автодороги
- площадки складирования
- - стоянки крана
- - направление движения крана КС-4361
- подмости ЦИМИОМТП
- приставная лестница
- ① - номер очереди и направление производства работ

- 1- рама каркаса;
- 2- полурама каркаса;
- 3- подкрановая балка;
- 4- прогон покрытия;
- 5- картина покрытия;
- 6- панель покрытия;
- 7- стенная панель наружная;
- 8- фундамент


Последовательность монтажа здания

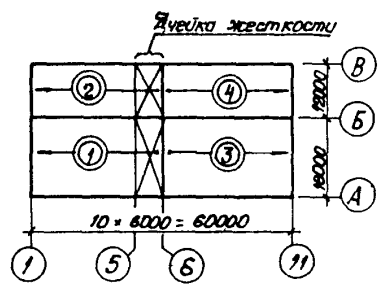

6547030004

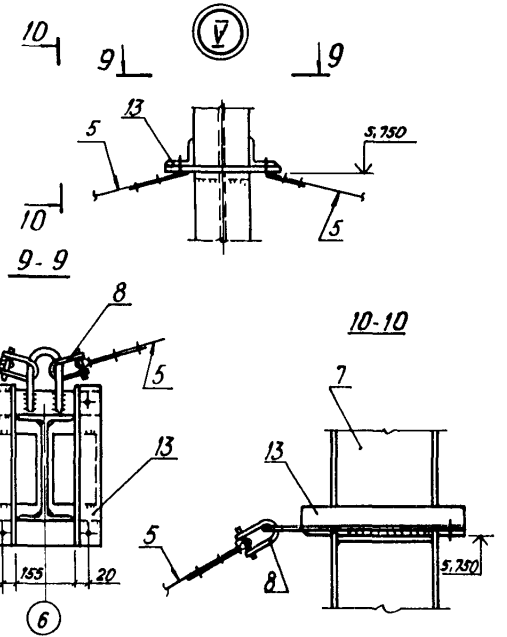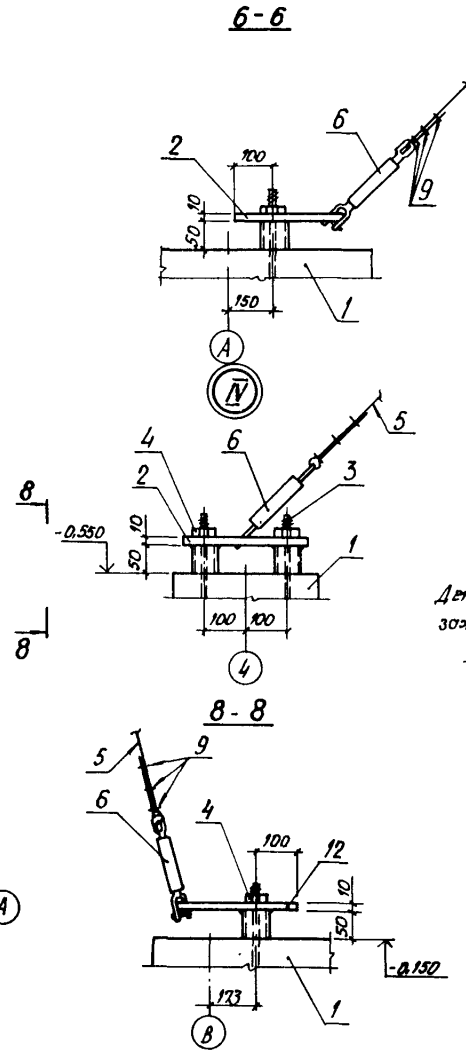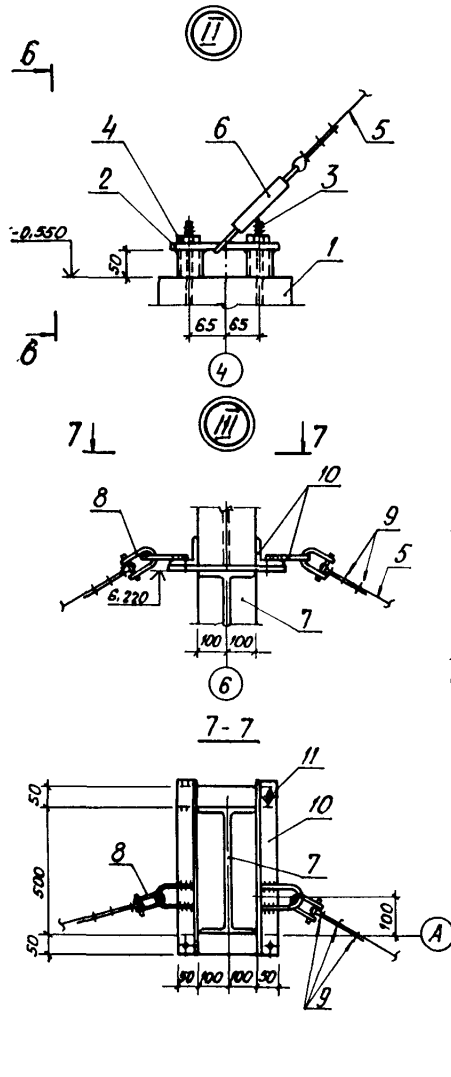


Деталь установки зажимов на расчалке



- 1- фундамент по проекту; 2 - анкер А-1;
- 3- анкерный болт М42 (по проекту); 4- гайка М42;
- 5- расчалка из каната; 6- талреп, Q = 0,5т;
- 7- стойка рамы; 8- скоба такелажная, типоразмер 1,7; 9- разжимной зажим; 10- хомут М-1;
- 11- болт М12; 12- анкер А-2; 13- хомут М-2


1. Узлы II - V заштрихованы на л. 16  
 2. Хомуты М-1, М-2, анкеры А-1, А-2 разработаны на л. 19.

Схема монтажа первых рам каркаса по оси "Б"

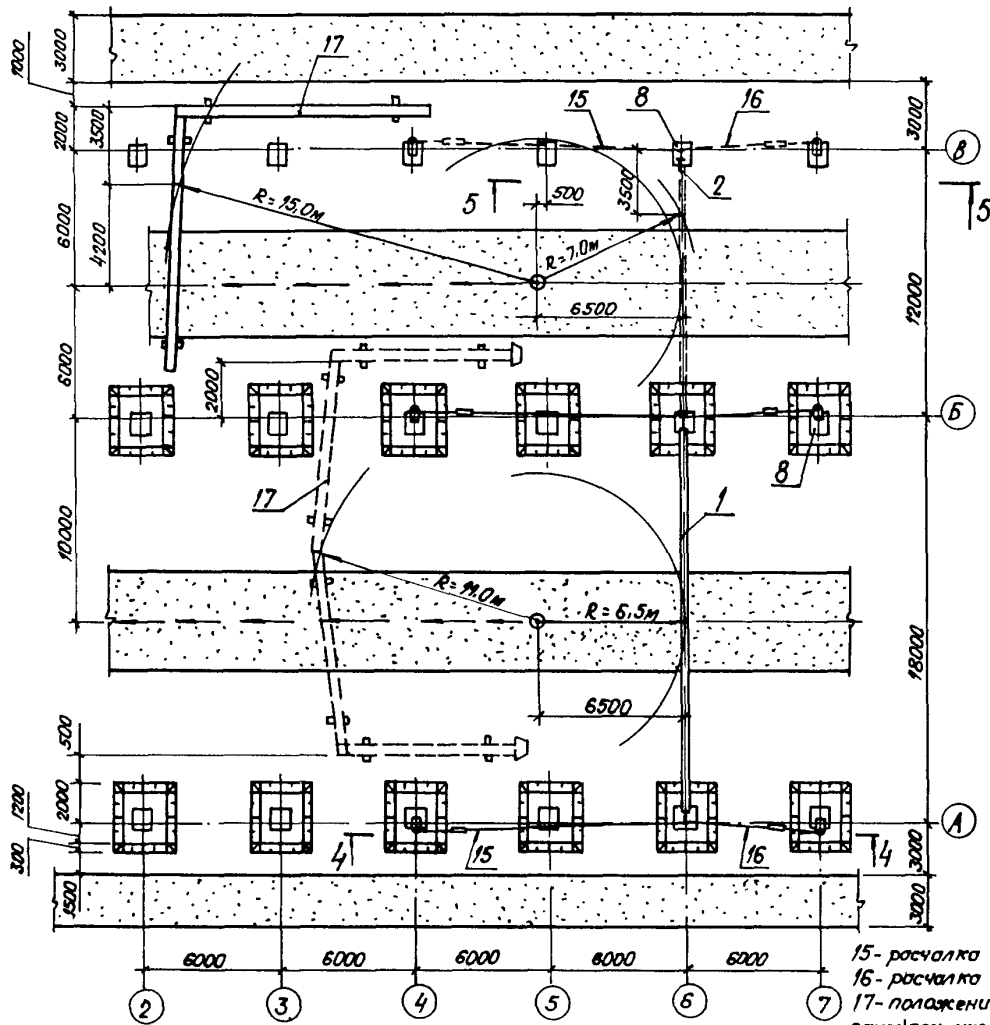


15 - расчалка РЧ-1;  
 16 - расчалка РЧ-2;  
 17 - положение рамы (полу-  
 рамы) при укрупнительной сборке

4-4

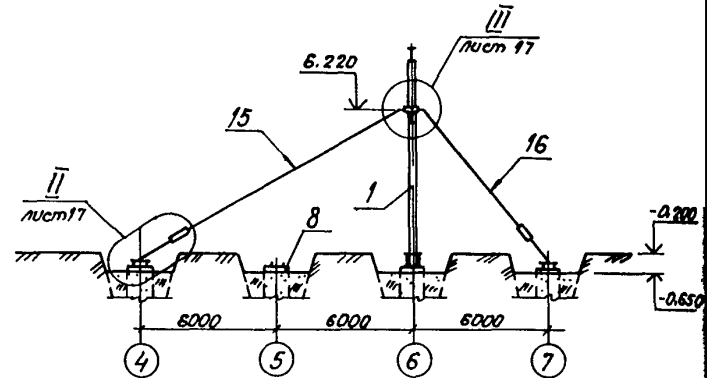



5-5

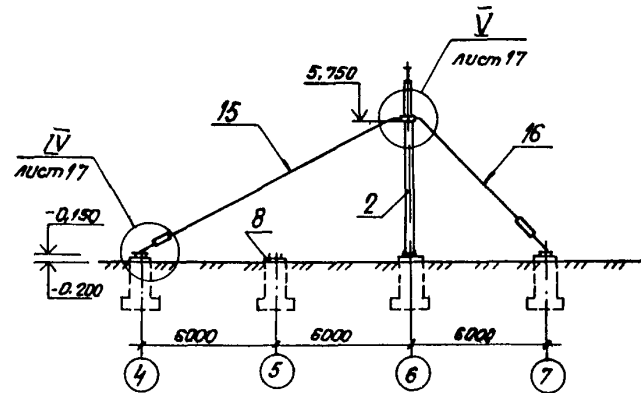

Данный лист смотреть совместно с л. 14


6547030004

Схема поворота рамы вокруг подвижного шарнира (скольжением)

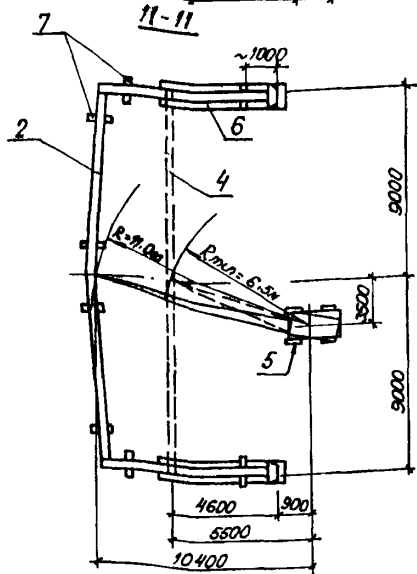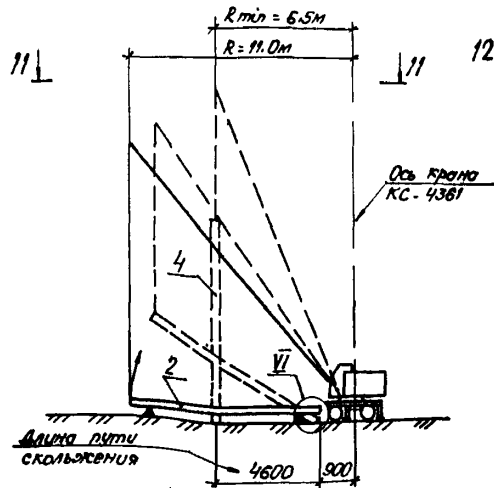


VI

(рама в горизонтальном положении)




12-12



ОП-1

Поз.1

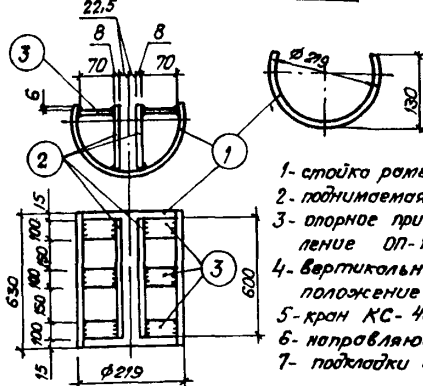


- 1- стойка рамы;
- 2- поднимаемая рама;
- 3- опорное приспособление ОП-1;
- 4- вертикальное положение рамы;
- 5- кран КС-4361;
- 6- направляющая из СТ;
- 7- подкладки из шпала

Спецификация металлических изделий (сталь марки ВСт3пс5)

Марка элем.	№ дет.	Сечение	Длина, мм	Кол-во		Масса, кг		Прим.
				г	м	дет	всех	
ОП-1	1	изтр $\phi 219 \times 8$	630	1		26.2	26.2	37,5
	2	-115 $\times$ 8	600	2		4.3	8.6	
	3	-70 $\times$ 8	100	6		0.4	2.4	
1% на сварку:							0.3	

VII

(рама в процессе подъема)



1. Подъем рам после укрупнения выполнять методом поворота вокруг подвижного шарнира (скольжением) в два этапа: поднять раму, уменьшив вылет стрелы крана до  $R_{min} = 6,5m$ , затем привести раму в вертикальное положение, подняв крюк крана, при этом опорная часть колонны будет скользить по основанию.
2. Для уменьшения сил трения при скольжении рам, а также для предохранения башмаков колонн от снятия необходимо до подъема рамы надеть на башмаки колонн опорные приспособления ОП-1, поверхность скольжения направляющих покрыть смазкой.

6547030004



Схема монтажа второй рамы каркаса

13  
лист 21


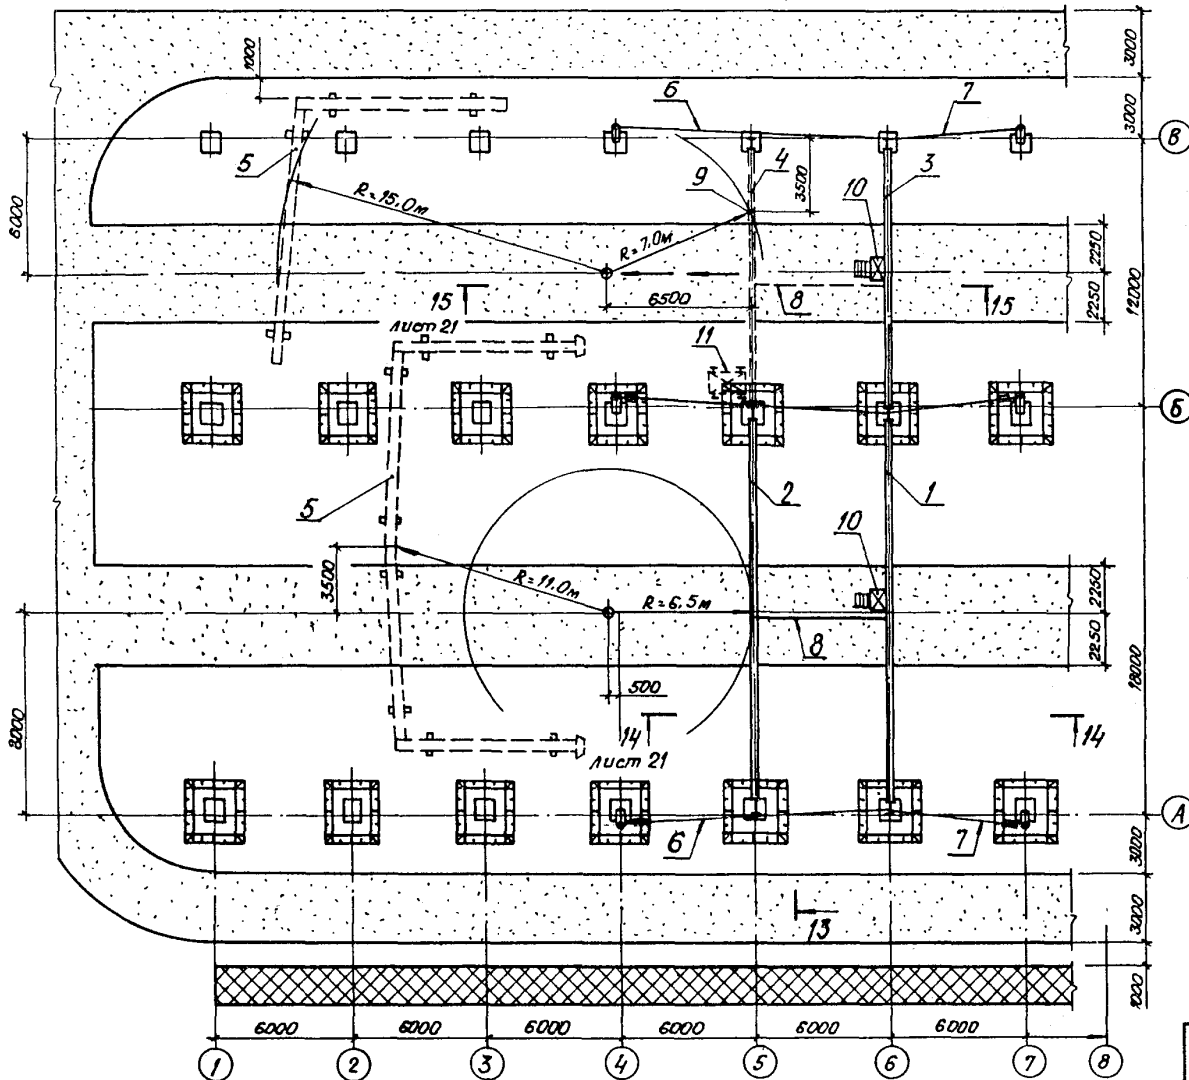


Схема подъема рамы пролетом 12м методом поворота без отрыва от земли

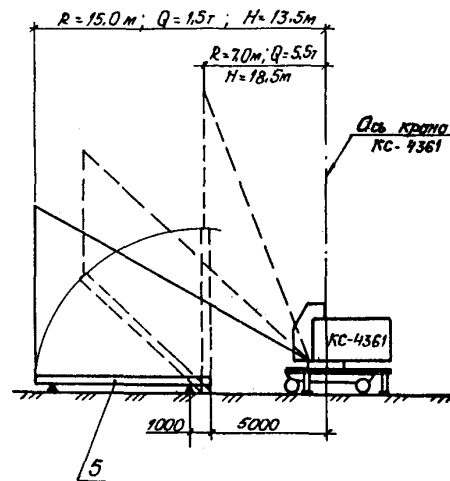


- 1- рама 1;
  - 2- рама 2;
  - 3- полурама 1;
  - 4- полурама 2
- } в проектном положении;
- 5- положение рамы (полурамы) перед подъемом;
  - 6- расчалка РЧ-1; 7- расчалка РЧ-2;
  - 8- временная распорка; 9- центр тяжести полурамы;
  - 10- приставная лестница ЛА-4;
  - 11- подмости ЦНИИОМТП

Монтаж каркаса пролета 12м (оси Б-В) начинать после монтажа всех конструкций пролета 18м (оси А-Б) согласно схеме разбивки на очереди.


6547030004

Лист  
20


13-13

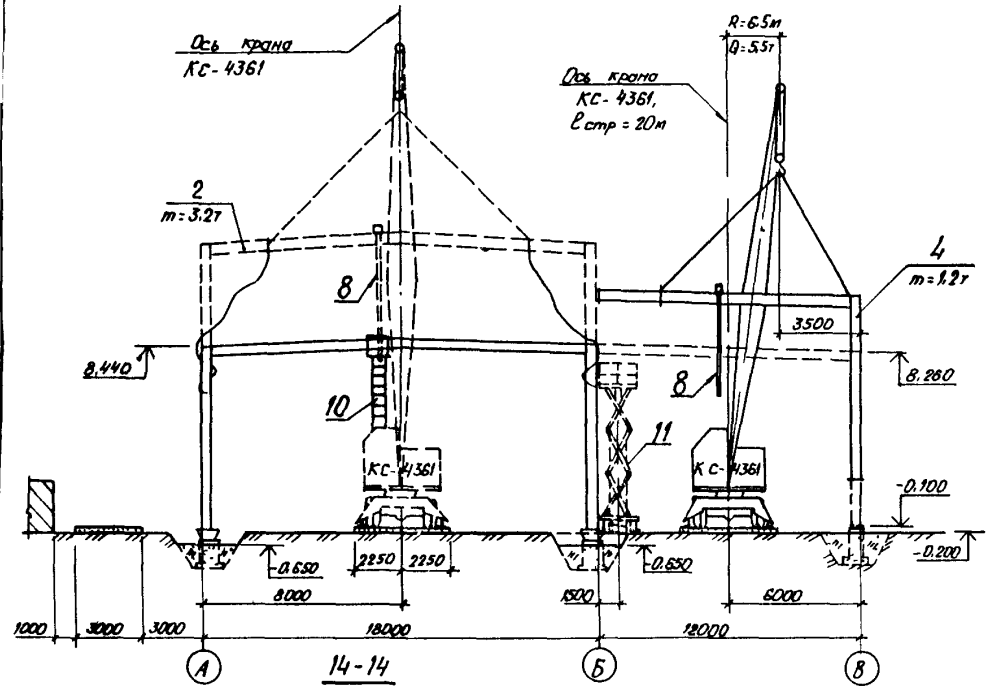

15-15


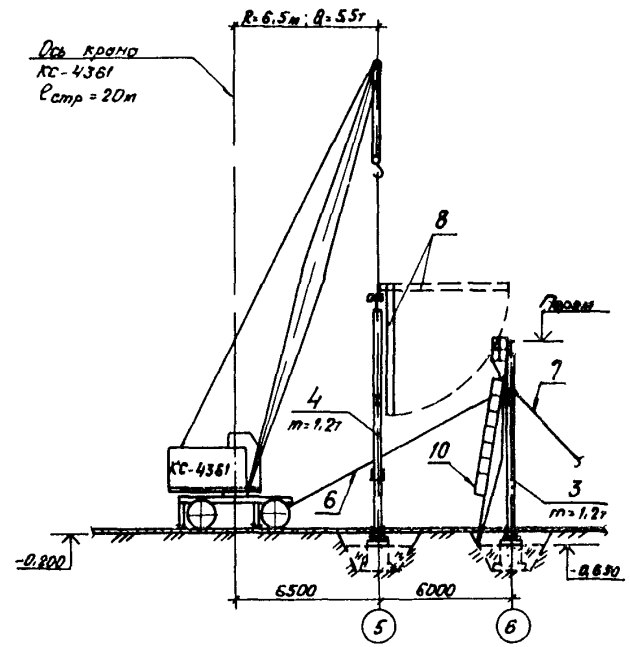


14-14

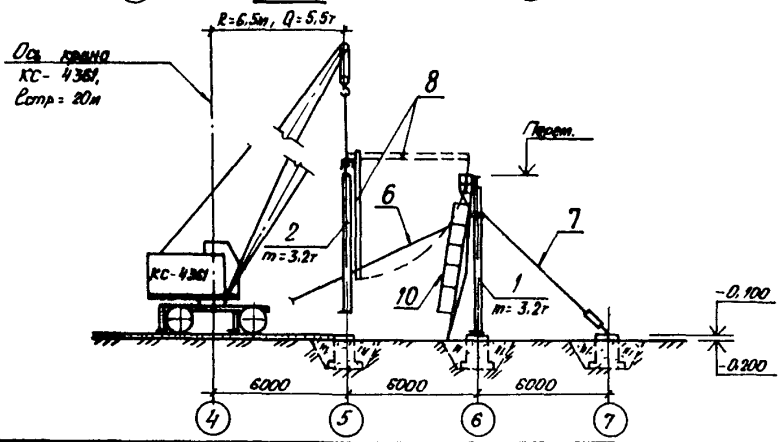

1 Данный лист рассматривать совместно с л 20  
 2 Схемы строповки конструкций приведены на листах 30-32

Схема монтажа подкрановых балок

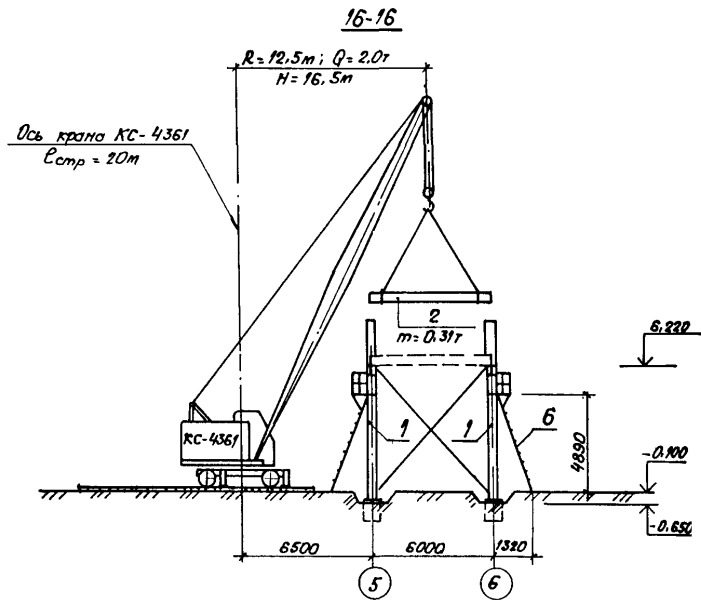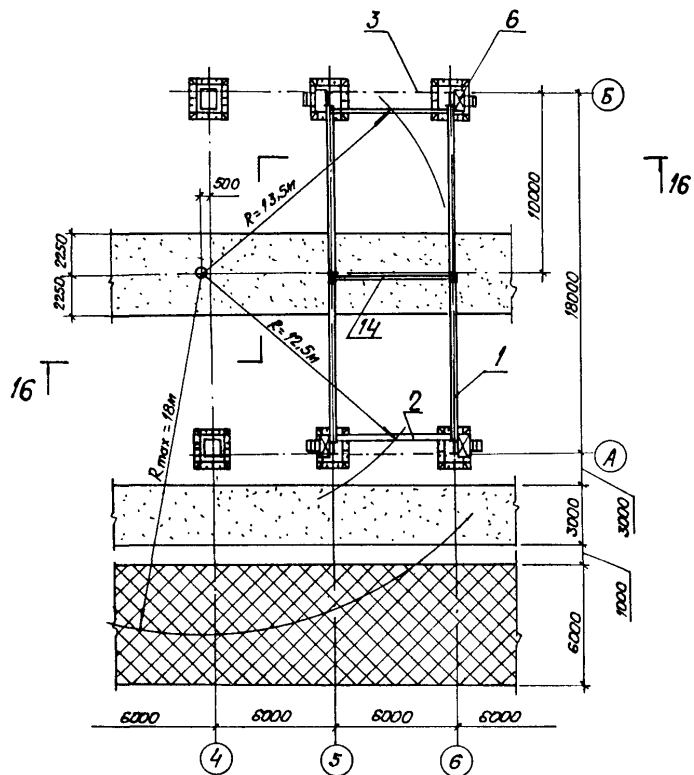

- 1- рама каркаса;
- 2- подкрановая балка;
- 3- вертикальная связь;
- 4- ригель стеновой;
- 5- панель стеновая;
- 6- приставная лестница 1-1;
- 7- передвижная площадка;
- 8- подмости ЦНИИОМТП;
- 9- лестница с монтажной площадкой;
- 10- лестница 1А-1;
- 11- страховочный трос из каната  $\phi$  11мм по ГОСТ 2688-80;
- 12- петля из  $\phi$  16;
- 13- смонтированная часть здания;
- 14- временная распорка

6547030004



Схема монтажа элементов стенового ограждения (пролет 18м)











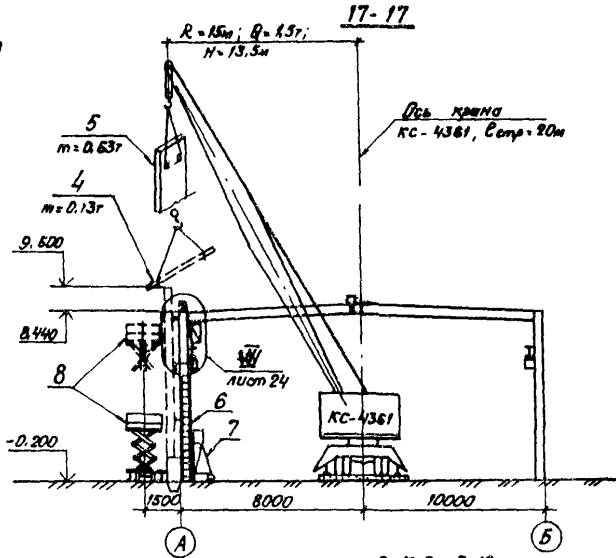


Схема монтажа элементов стенового ограждения (пролет 12м)

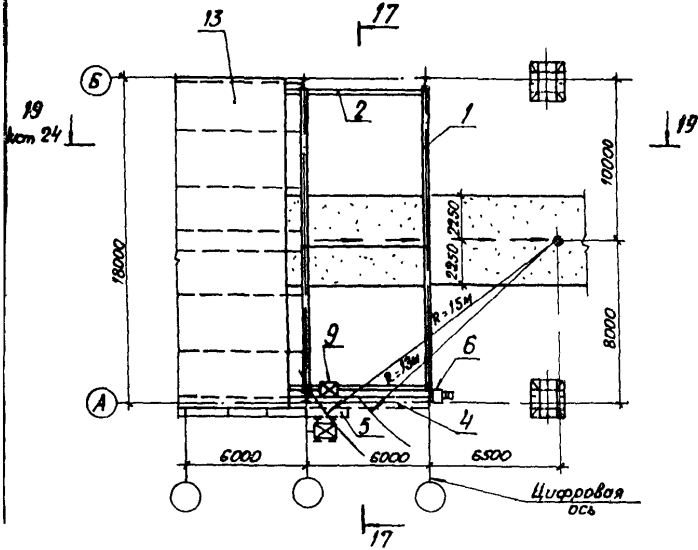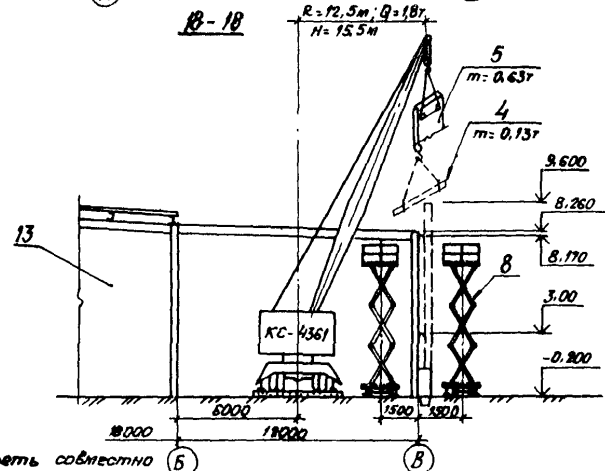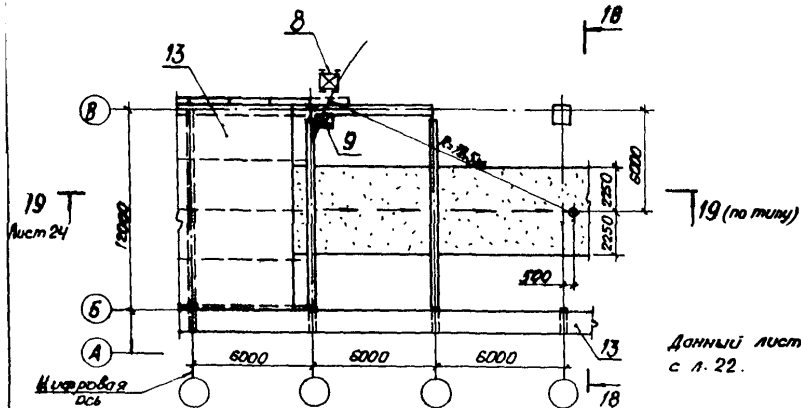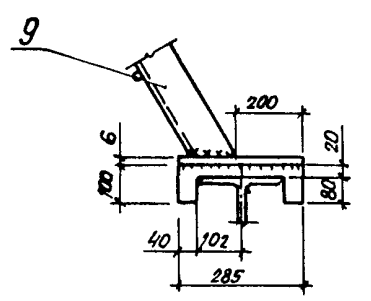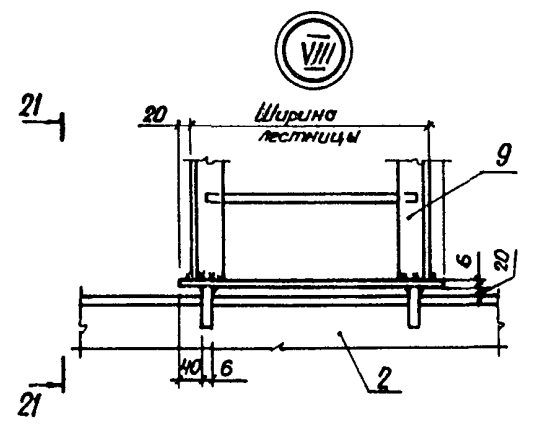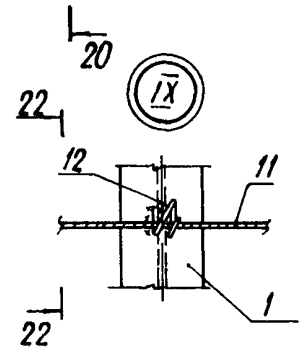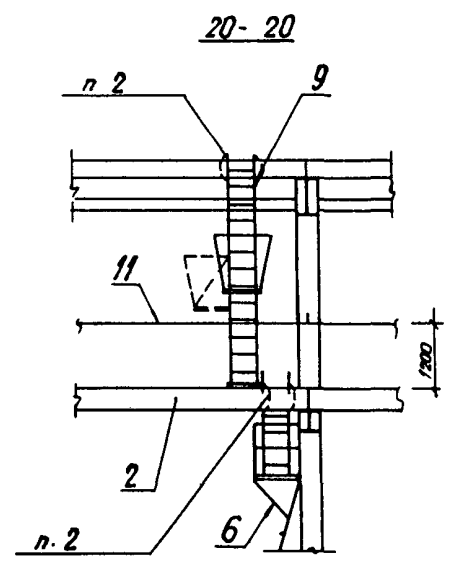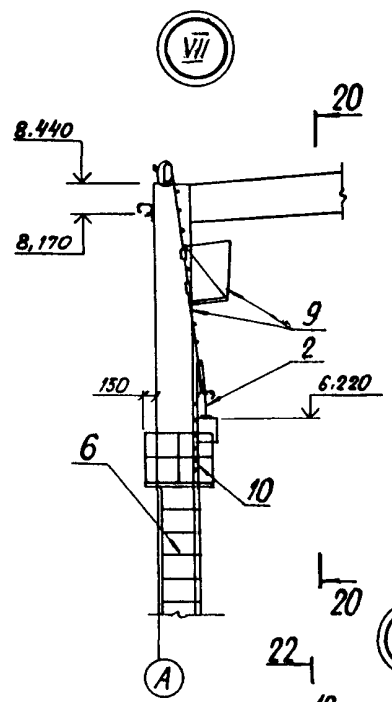

Данный лист смотреть совместно с л. 22.

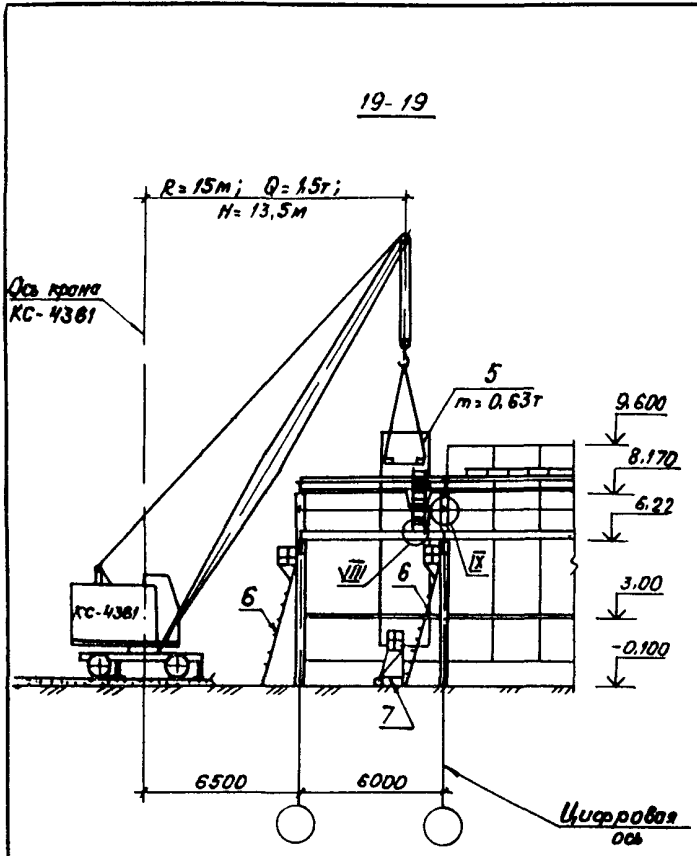

1. Данный лист смотреть совместно с л.л. 22, 23.
2. Крюки навесных лестниц (узел VII) привязать отожженной стальной проволокой  $\phi 4-5mm$  в обе нитки к смонтированным и надежно закрепленным конструкциям.
3. Страховочный трос крепить к смонтированным катанкам, натянуть с помощью фаркопа, провисание троса ограничивать специальным устройством (узел IX).

Схема монтажа покрытия ячейки  
(пролет 18м)





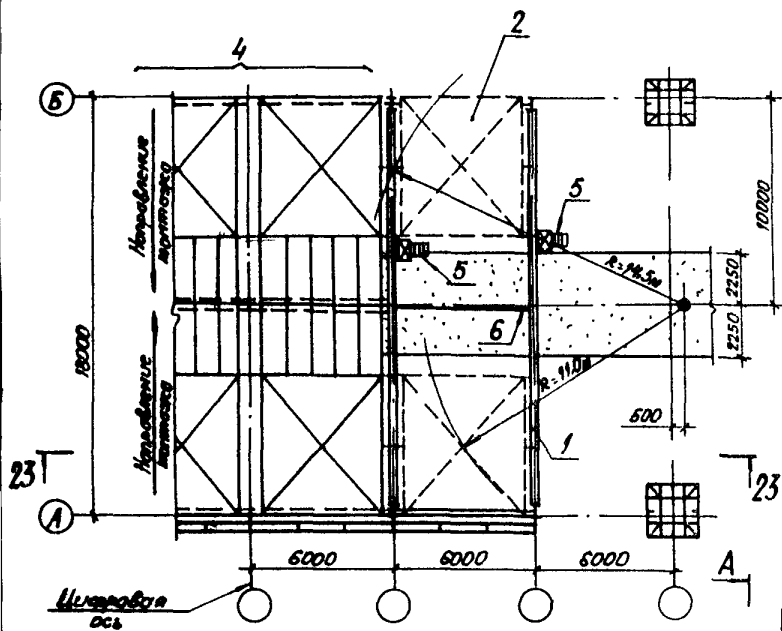


Схема укладки картины на шаблон при укрупнительной сборке

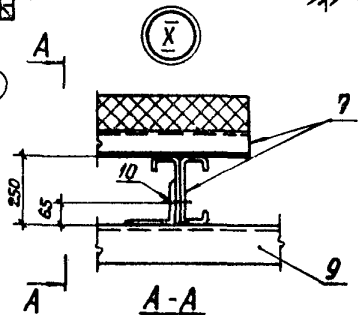



23-23

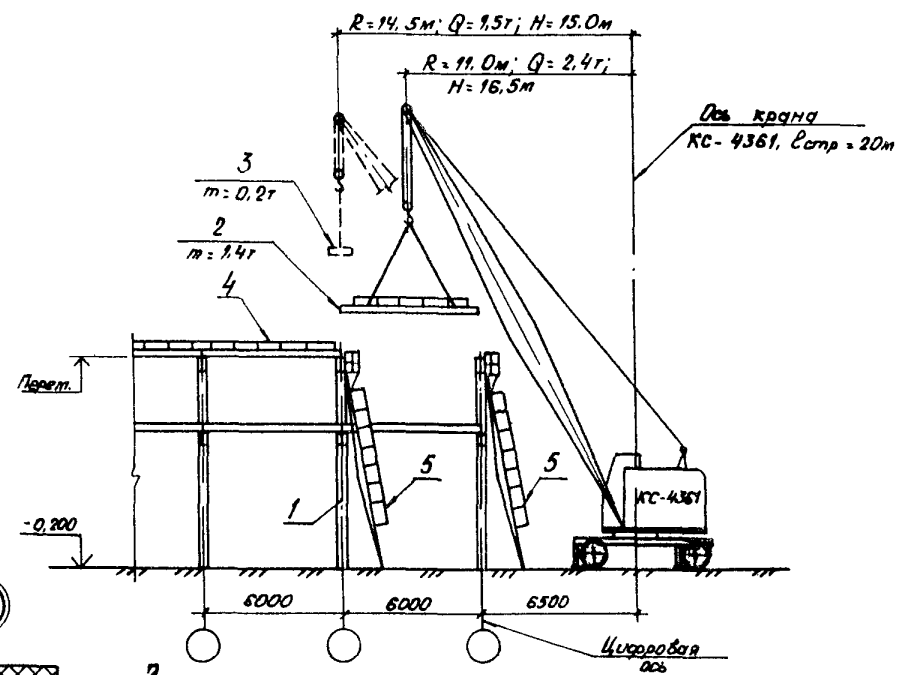

- 1-рама каркаса; 2- картина покрытия;
  - 3-панель двоярная, 4-стационарная часть по-
  - крытия; 5- приставная лестница ЛА-4,
  - 6-временная распорка; 7- укрупняемая картина
  - покрытия; 8-дополнительный прогон; 9-шаблон Ш-1,
  - 10- болт М12.
- ПРИМЕЧАНИЯ.**
- 1 Прогоны укрупняемых картин крепить к шаблону Ш-1 на болтах М12
  - 2 Конструкция шаблона Ш-1 дана на л 29
  - 3 При укрупнительной сборке картин покрытия, имеющих два прогона, на шаблон укладывать дополнительный прогон (из нестационарных) и крепить его аналогично прогонам картин


6547030004

Схема монтажа покрытия ячейки  
(пролет 12 м)

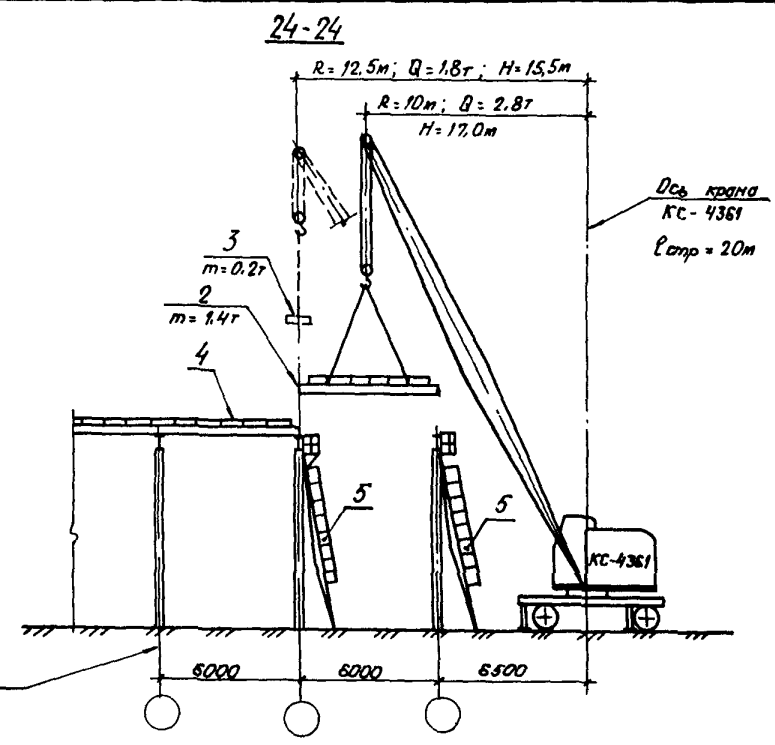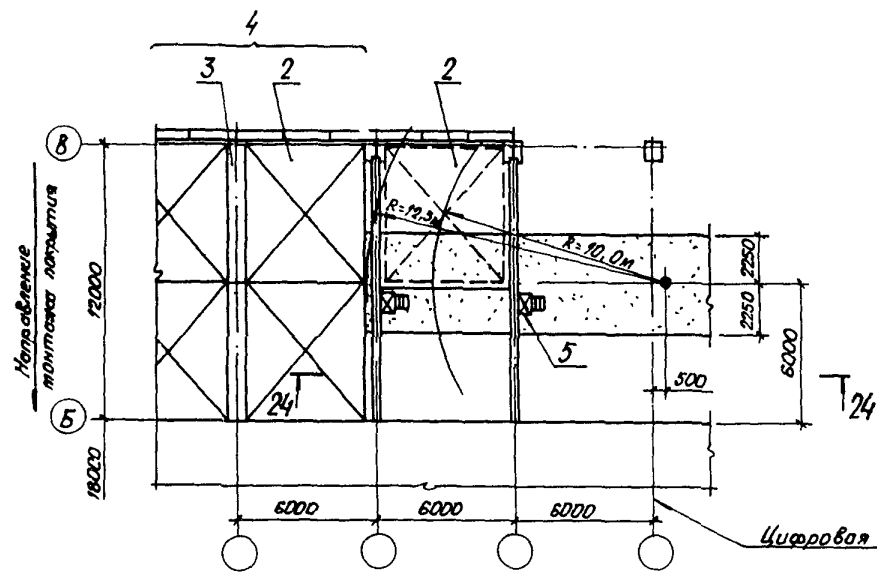


Данный лист смотреть совместно с л. 25.

Маркировочная схема раскладки картин (пролет 18 м)

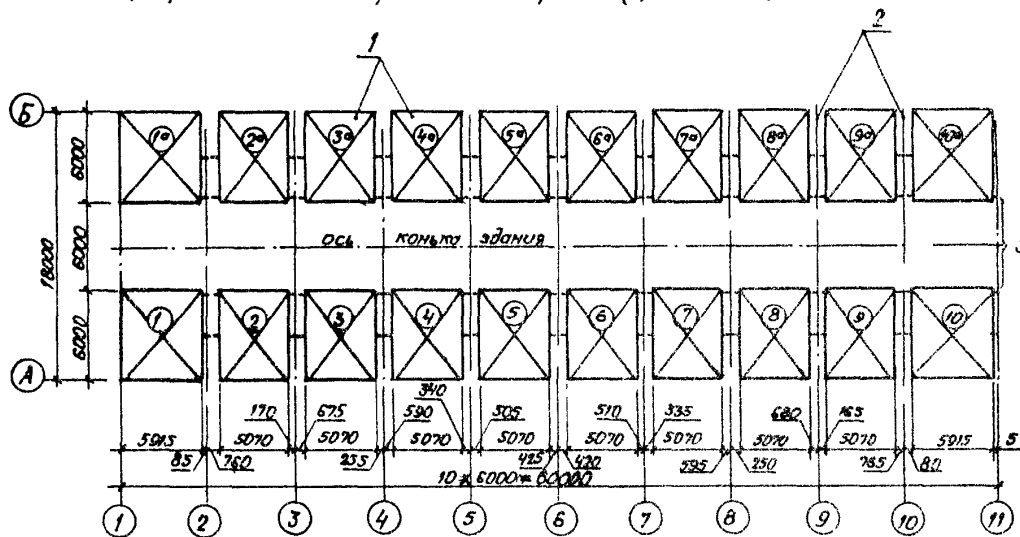

Тип картины 1; 10

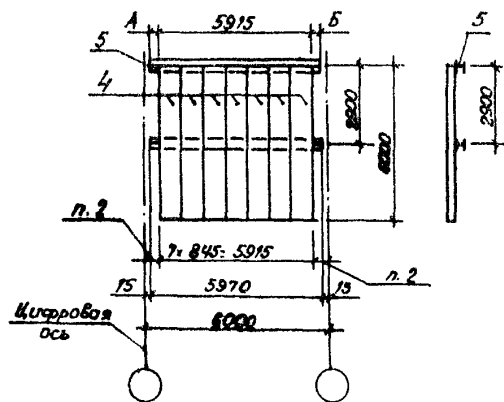

Тип картины 2-9

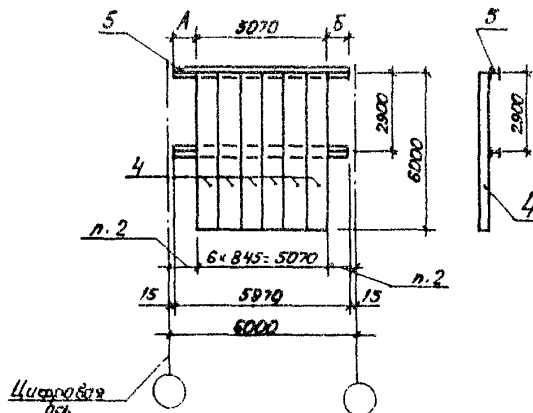


Таблица типоразмеров картин покрытия, мм

Тип картины	Размер картины		Размер консоли прозона	
	ширина	длина	А	Б
1	5915	6000	—	85
2	5070	6000	760	170
3	5070	6000	875	235
4	5070	6000	980	340
5	5070	6000	505	413
6	5070	6000	420	510
7	5070	6000	335	595
8	5070	6000	250	680
9	5070	6000	165	765
10	5915	6000	80	5

1- укрупненные картины; 2- место укладки доборных панелей; 3- участок повышенной монтажа панелей; 4- панели ППН; 5- прогон покрытия

1. Картины укрупнять согласно маркировочной схеме, при этом строго соблюдать размеры консольной прозона, указанные в таблице типоразмеров картин покрытия
2. Привязка укладки доборных панелей ППН к осям здания указана на маркировочной схеме
3. Крепление панелей ППН к прозонам выполнять по проекту
4. Между смежными картинами покрытия уложить доборные панели.
5. Укрупнение картин с индексом, а выполнять зеркально

6547030004

27

Маркировочная схема раскладки картин (пролет 12м)


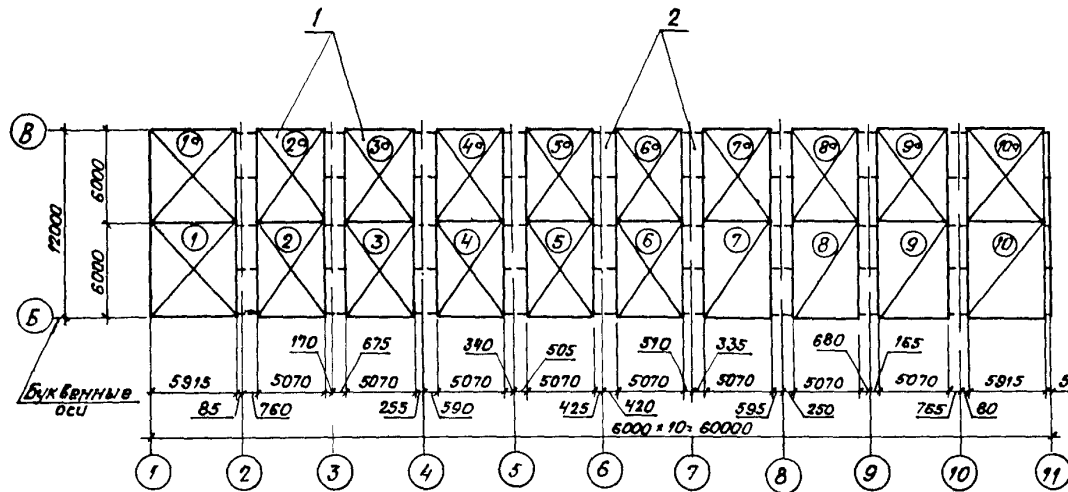



Таблица типоразмеров картин покрытия, мм

Тип картины	Размер картины		Размер консоли прозема	
	ширина	длина	А	Б
1	5915	6000	—	85
2	5070	6000	760	170
3	5070	6000	675	255
4	5070	6000	590	340
5	5070	6000	505	425
6	5070	6000	420	510
7	5070	6000	335	595
8	5070	6000	250	680
9	5070	6000	165	765
10	5915	6000	80	5

Тип картины 1; 10

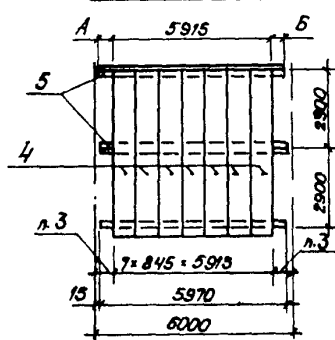


Тип картины 2-9

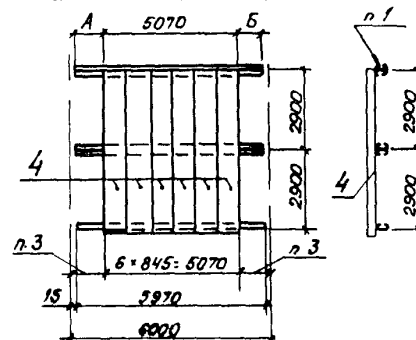


1. Укрупнение картин с индексом „а“ выполнять зеркально, без собственного крайнего прозема.
2. Данный лист смотреть совместно с л. 27.
3. Привязка укладываемых панелей ПП1 к осям здания указана на маркировочной схеме.

6547030004

Шаблон Ш-1

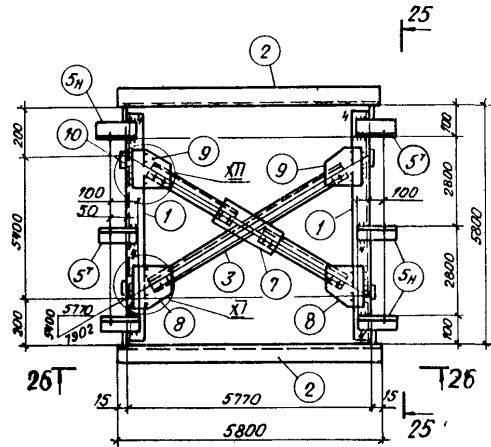

25-25




Спецификация на один элемент  
(сталь марки ВСт 3 кп 2)


Марка эл-та	№ дет	Сечения	Длина, мм	К-во		Масса, кг		Примечание
				г	ч	шт	вкл.	
Ш-1	1	Г16	5760	2		82	164	464
	2	Г16	5800	2		82	164	
	3	L 75*6	7420	1		51	51	
	4	L 75*6	3720	2		28	52	
	5	L 63*5	140	3	3	1	6	
	6	-100*6	160	4		1	4	
	7	-140*6	460	1		3	3	
	8	-230*6	280	2		2.5	5	
	9	-230*6	350	2		3	8	
	10	• φ16	360	4		1	4	
1% на сварные швы							5	

Пос. 5'

26-26



Элементы связи

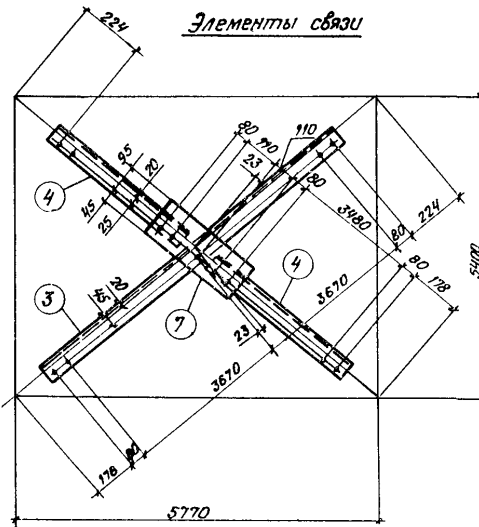


- 1 Шаблон Ш-1 использовать для изготовления картин из кровельных панелей
- 2 Все отверстия  $d=17$ .
- 3 Все отрезки 40 мм
- 4 Все швы  $K_f=5$  мм /краме оговоренных
- 5 Сварку производить электродами типа 342 по ГОСТ 9467-75\*


654 703 0004

*Схемы строповки конструкций  
балок рамы при укрупнительной сборке*



*стоек рамы при укрупнительной сборке*

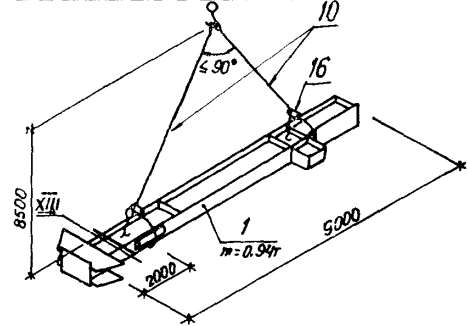


*подкрановых балок*

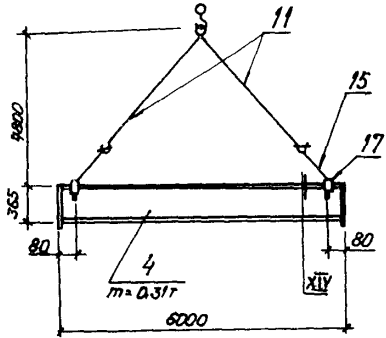


*(XIV)*

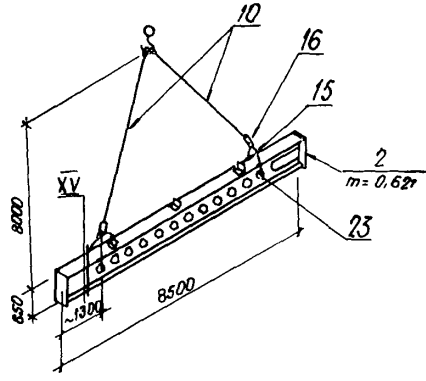


*цокольной стеновой панели*

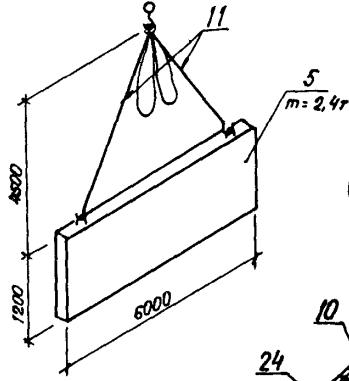


*(XIII)*



*рамы каркаса при монтаже*

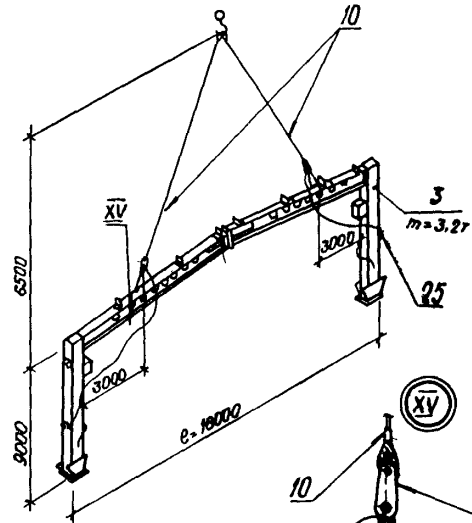

*(XV)*




1. Данный лист смотреть совместно с лл.31,32.
2. Под стропы в местах изгиба или острых углов элементов поднимаемых конструкций подкладывать инвентарные металлические подкладки (узел XV).

654 7030004




Схемы строповки конструкций




стеновой панели  
(ширина 2 м)

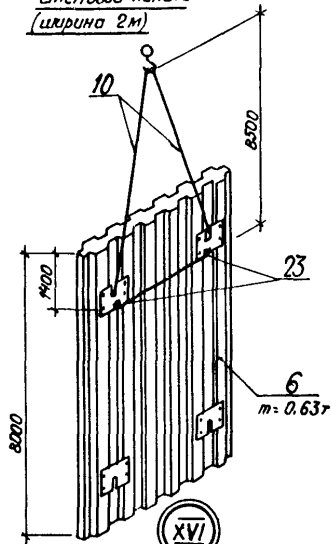




кровельной панели ПКМ-120

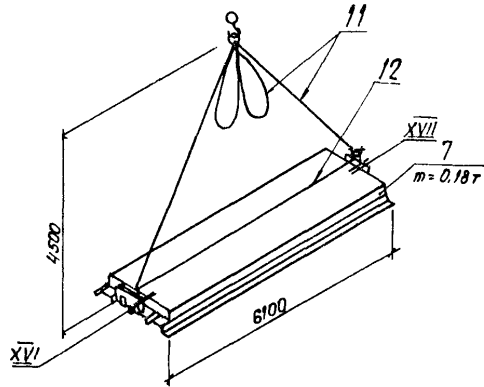

картин покрытия  
размером 6x6 м

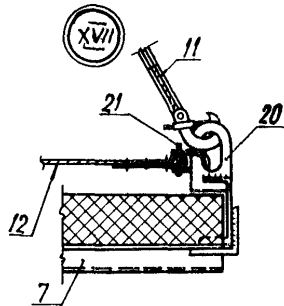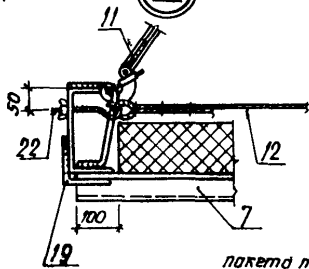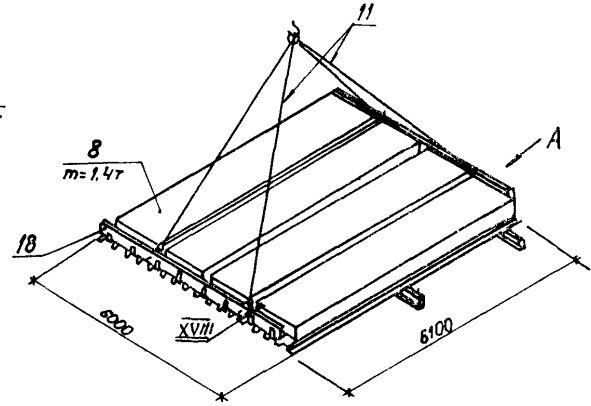



пакета панелей ПКМ-120

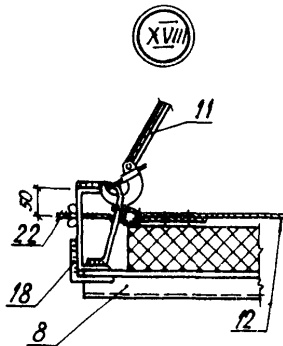

1. Данный лист рассмотреть совместно с л 30.32
2. Петлю поместить в шов между панелями

6547030004

Схема строповки рамы  
пролетом 12 м

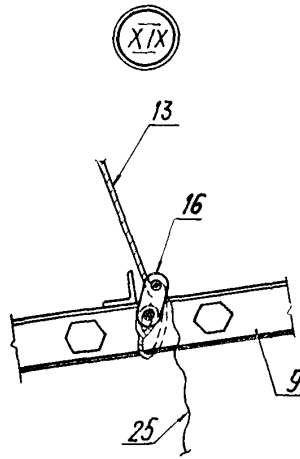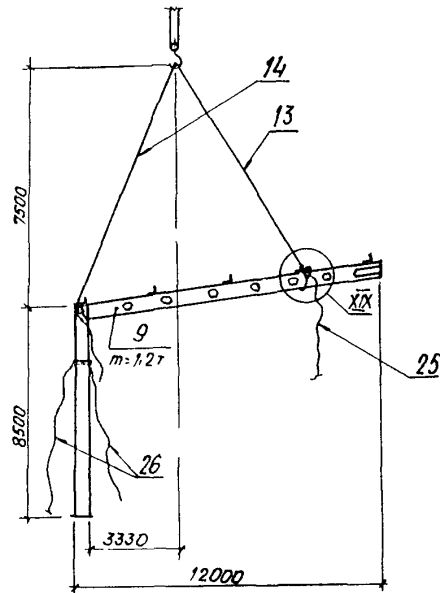


- 1- стойка рамы, 2- балка рамы; 3- рама каркаса;
- 4- подкрановая балка, 5- цокольная стеновая панель;
- 6- трехслойная стеновая панель,
- 7- кровельная панель ПКМ-120; 8- картина покрытия;
- 9- полурама каркаса; 10- строп СКП1- 2.5/10200,
- 11- строп 4СК1- 3.2/5000, 12- строп СКП1- 0.32/7160;
- 13- строп СКП1- 1.1/8000; 14- строп СКП1- 1.1/9000;
- 15- строп СКП1- 0.32/1500, 16- пружинный замок ПР- 3,2; 17- захват КР 3,2;
- 18- траверса ТР-1; 19- захват ЗХ-1; 20- захват ЗХ-2;
- 21- скоба такелажная, типоразмер 1,7; 22- болт М16,
- 23- инвентарные стальные подкладки под канат;
- 24- подкладки из круглого леса  $\phi 160$  мм,  $l=1000$  мм;
- 25- канат для дистанционной расстроповки;
- 26- расчалки РЧ-1, РЧ-2; 27- пакет панелей ПКМ-120

1 Данный лист рассматривать совместно с л. л. 30,31


2 Конструкция захватов ЗХ-1, ЗХ-2 и траверсы ТР-1 дана на л. 33

6547030004


Захват 3X-1

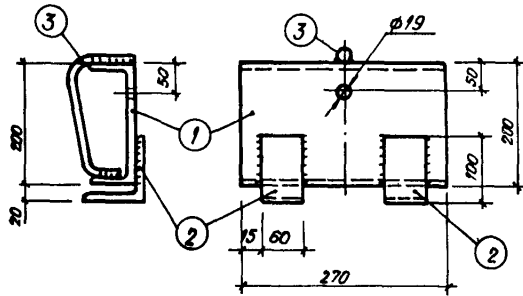


Захват 3X-2

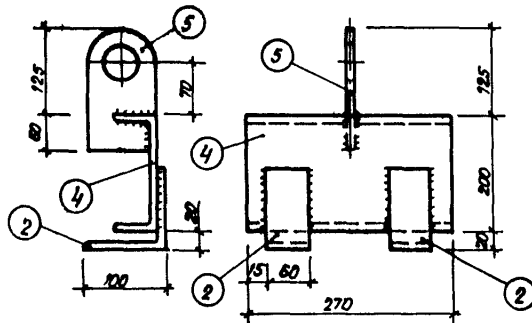


Траверса ТР-1



Дет. 5

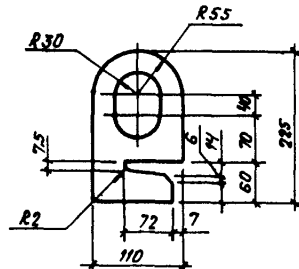

Дет. 3



Спецификация металлических изделий  
(Сталь марки ВСт3кп2)

Марка эле	№ дет.	Описание	Длина, мм	Кол-во		Масса, кг		Примечан
				г	н	шт.	общ	
3X-1	1	L 100×8	270	1		3,3	3,3	5,5
	2	L 100×8	60	2		0,7	1,4	
	3	φ16	265	1		0,5	0,5	
1% на сварку:							0,3	
3X-2	4	L 20	270	1		5,0	5,0	8,5
	5	-110×10	225	1		1,9	1,9	
	2	L 100×8	60	2		0,7	1,4	
1% на сварку:							0,2	
ТР-1	6	L 20	5640	1		103,8	103,8	115,6
	3	φ16	265	2		0,5	1,0	
	2	L 100×8	60	14		0,7	9,8	
1% на сварку:							1,0	

Вводятся элементы

Марка эле-та	Кол.	Масса, кг	
		шт.	общ
3X-1	1	5,5	5,5
3X-2	1	8,5	8,5
ТР-1	2	115,6	231,2



Итого 245,2

1. Сварку конструкции производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75<sup>а</sup>
2. Высота катета сварного шва равна 6мм

6547030004

Схема монтажа конструкций здания, II вариант  
 (I этап: монтаж каркаса, подкрановых балок и покрытия здания)

Последовательность  
 монтажа на I этапе

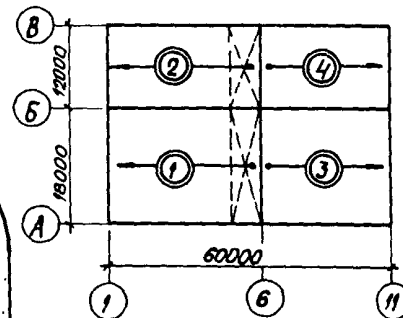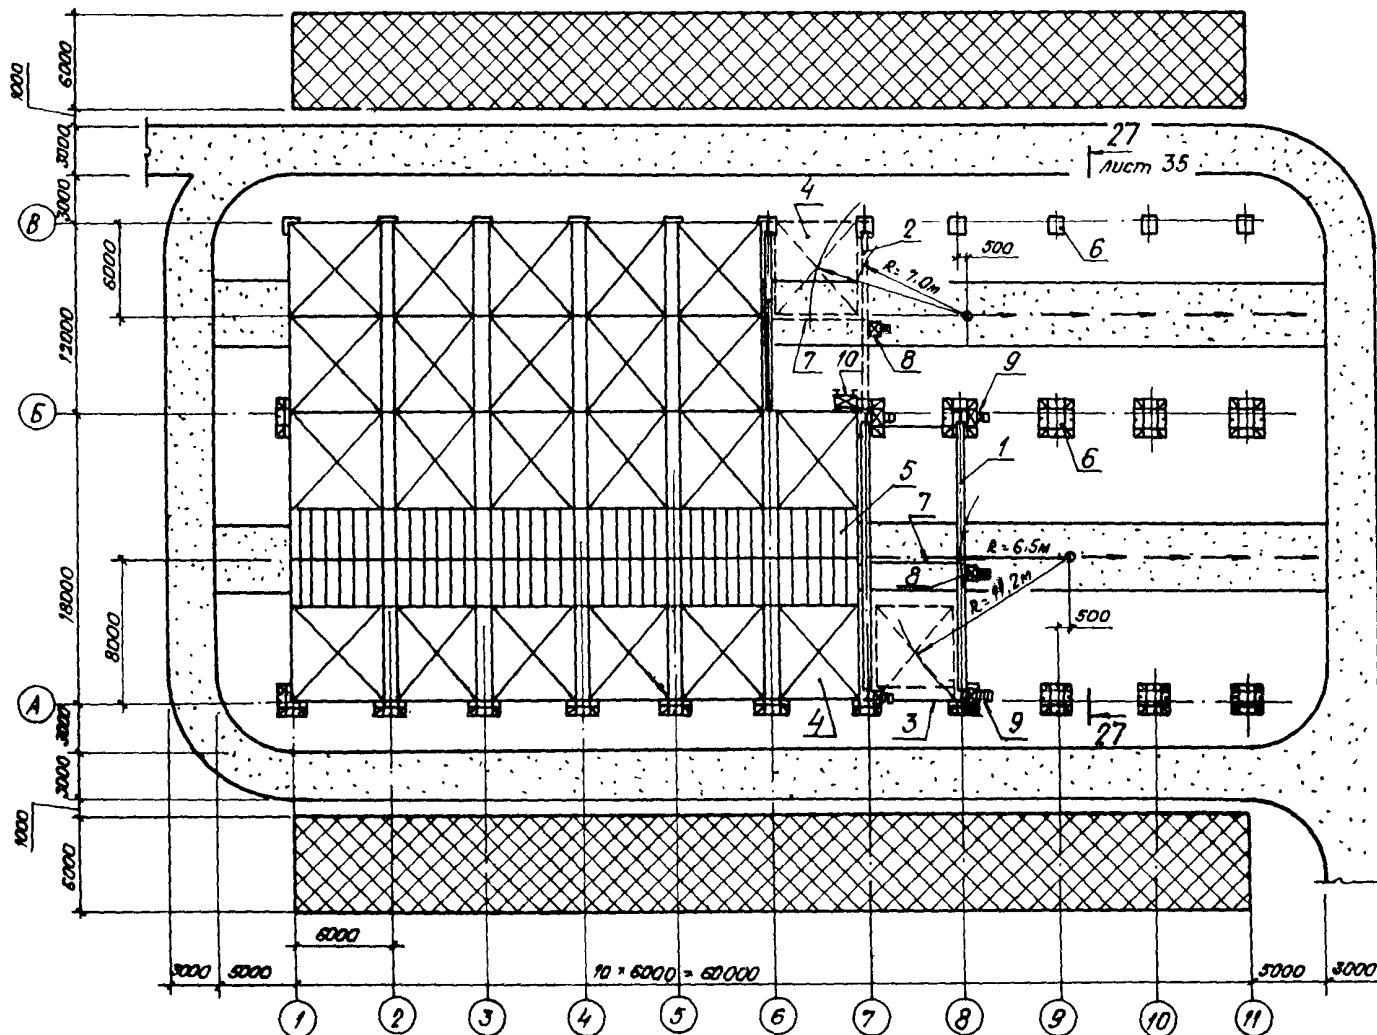


- 1 - рама каркаса;
- 2 - полурама каркаса;
- 3 - подкрановая балка;
- 4 - картина покрытия;
- 5 - панель покрытия;
- 6 - фундамент;
- 7 - временная распорка;
- 8 - приставная лестница ЛА-4;
- 9 - приставная лестница Л-1;
- 10 - подмости ЦНИИОМТП;
- 11 - трехслойная стеновая панель;
- 12 - автоподъемник АП-12


- 1. Основные условные обозначения по л. 14.
- 2. Данный лист читать совместно с л. 14.
- 3. По окончании монтажа конструкций на I этапе выполнить обратную засыпку котлована под фундаменты.

6547030004

27-27

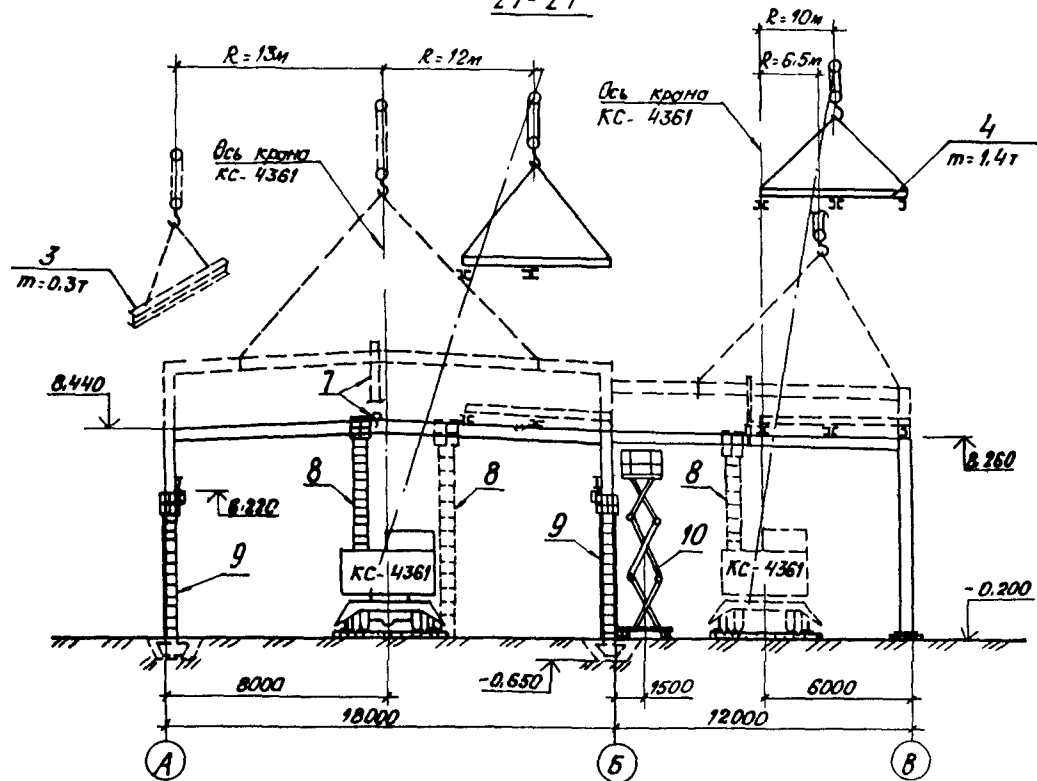


28-28

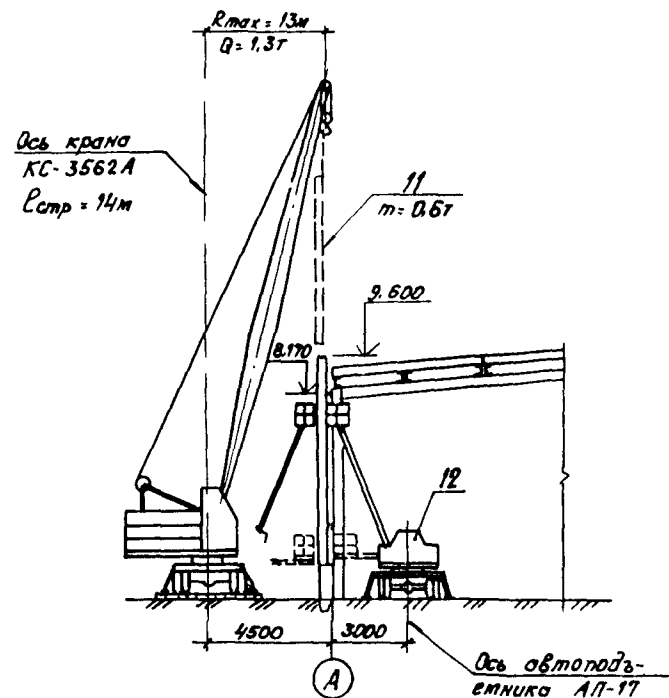

Данный лист читать совместно с л. 34.

Схема монтажа конструкций здания, II вариант  
(II этап: монтаж стеновых панелей и ригелей)

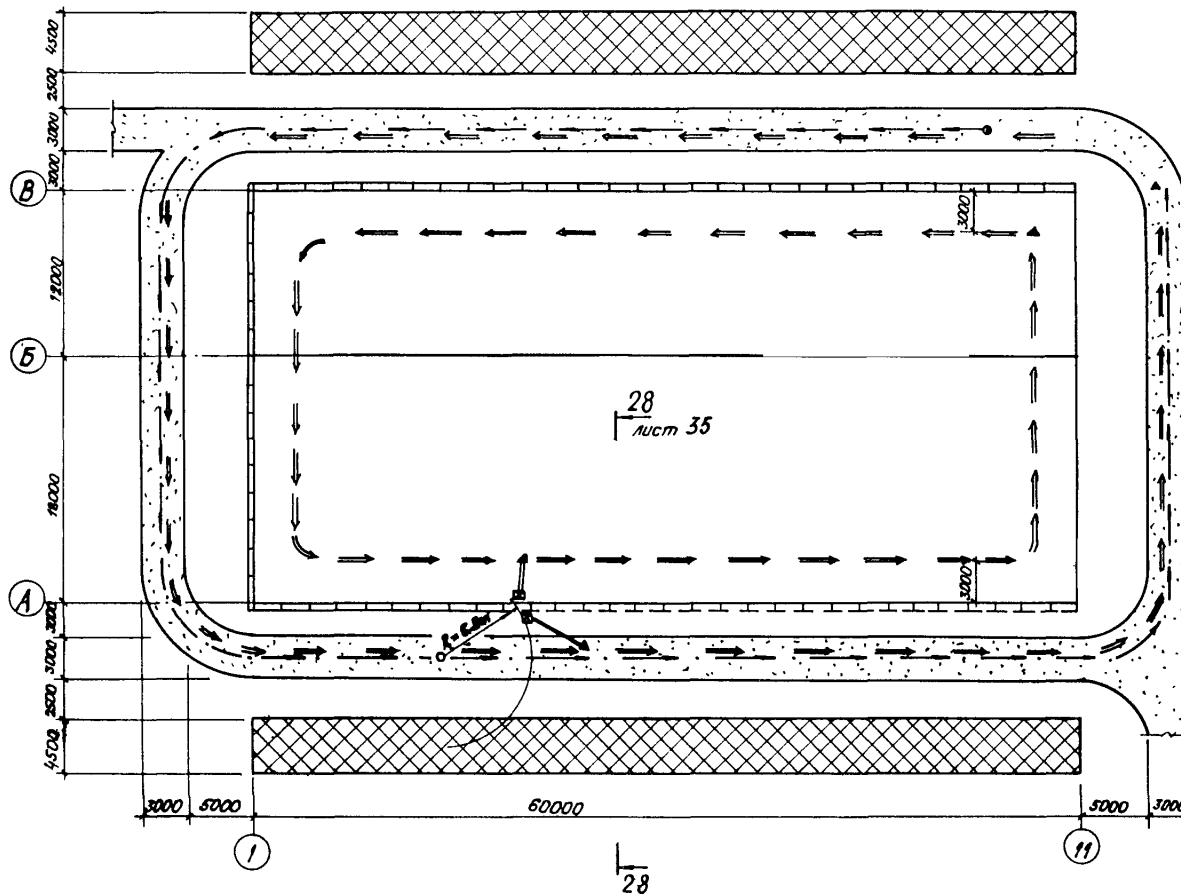

Условные обозначения

- — — — — направление движения крана КС-3562А
- ⊙ — стоянка крана КС-3562А
- — направление движения автоподъемника АП-17
- ↙ — стоянка автоподъемника АП-17


1. Условные обозначения на л. 14.
2. Данный лист рассматривать совместно с л. 34.
3. Монтаж стенового ограждения выполнять с помощью автомобильного крана КС-3562А,  $l_{стр} = 14м$ .

6547030004

Схема монтажа конструкции здания, III вариант


Последовательность монтажа

Направление работ

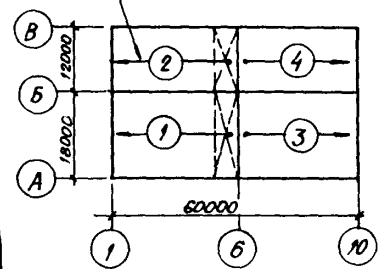

- 1- рама каркаса;
- 2- полурама каркаса;
- 3- подкрановая вышка;
- 4- картина покрытия;
- 5- панель покрытия;
- 6- трехслойная стенная панель;
- 7- фундамент;
- 8- временная распорка;
- 9- кран КС-4361;
- 10- автоподъемник АП-17


- 1. Основные узловые обозначения на л. 14.36.
- 2. Направление движения автоподъемника №1 показано внутри здания, автоподъемника №2 - снаружи здания. Автоподъемник №2 использовать при монтаже стеновых панелей.

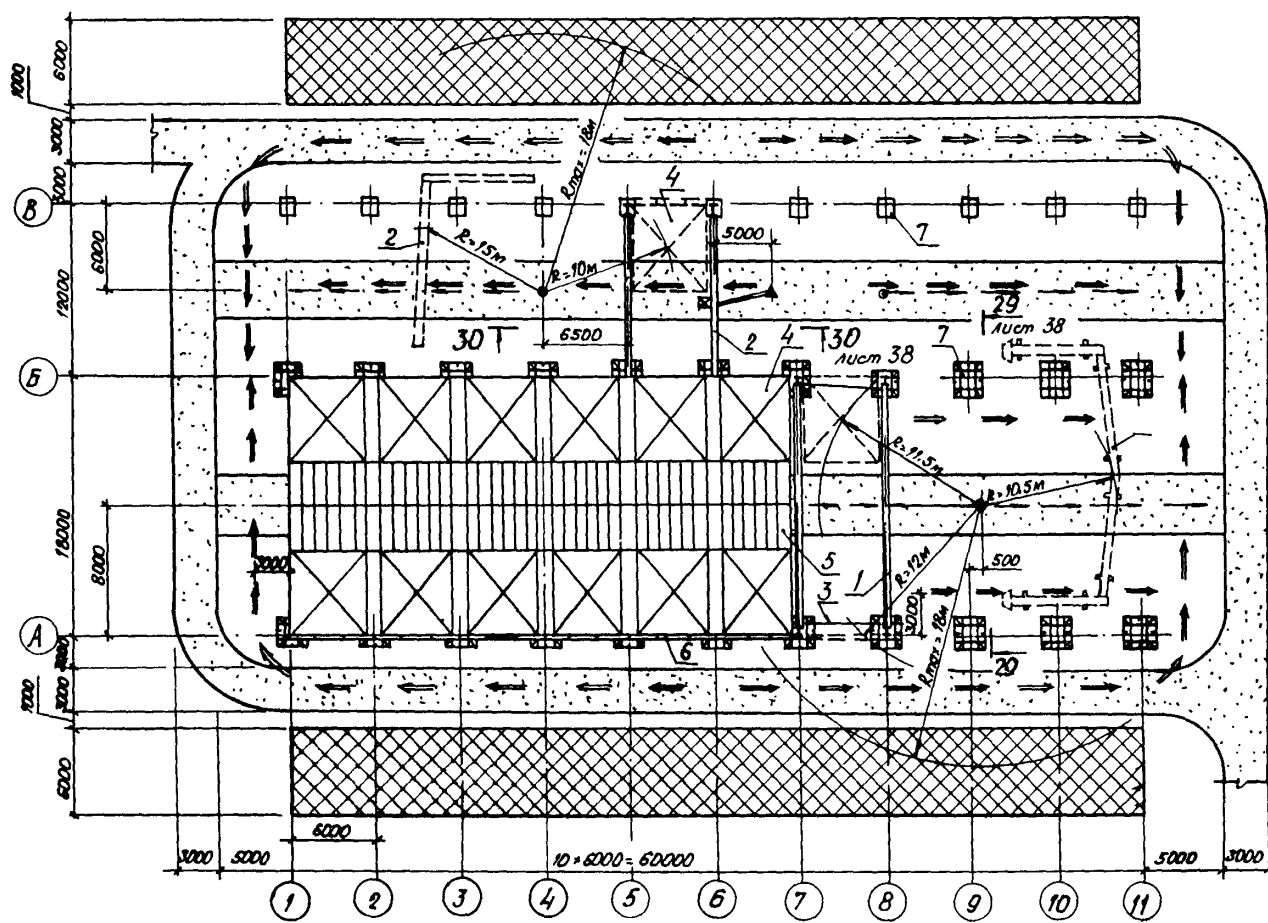


6547030004

Лист 37

29-29

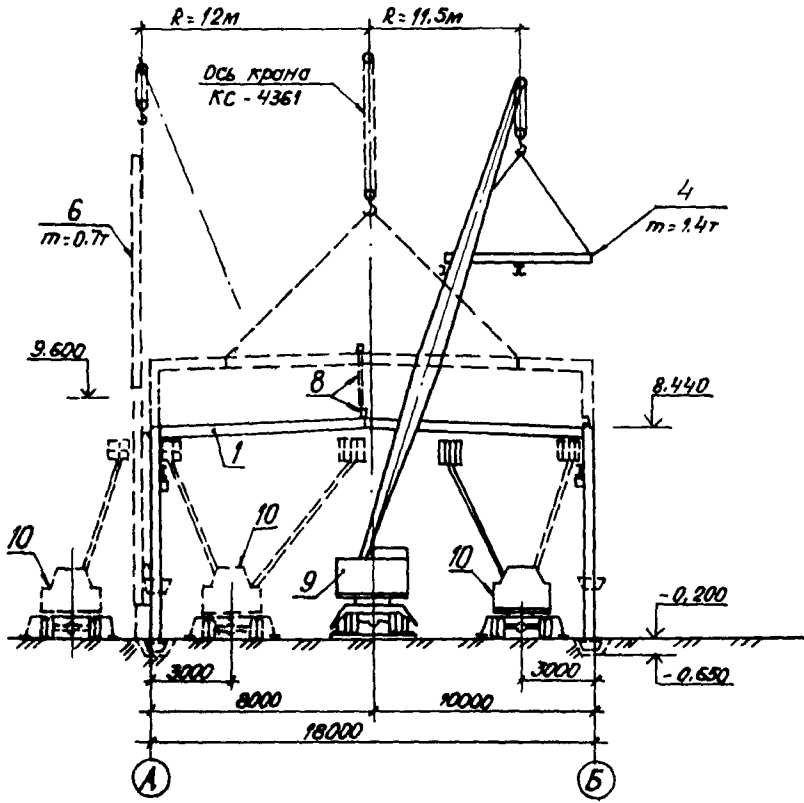

30-30

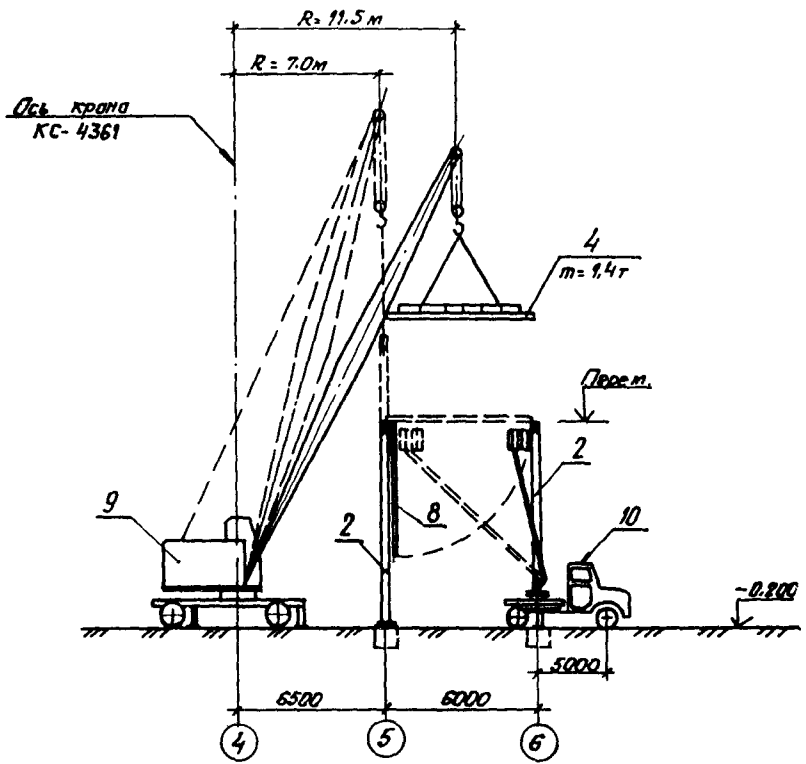


6547030004




### Схемы складирования конструкций


КОЛОНН





подпроновых балок и балок покрытия



цокольных стеновых панелей

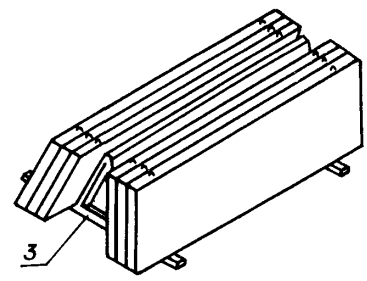

стенных панелей и панелей покрытия



- 1- подкладка из бруса 130 × 150 мм;
- 2- подкладка из доски 100 × 40 мм;
- 3- склад- пирамида

## 4. КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

## 4.1. Калькуляция № I на монтаж элементов каркаса здания.

Таблица 4

Наименование процесса	Номер фасета для пересчёта показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Заработная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Заработная плата с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
1. Разгрузка с автотранспорта приспособлений, инвентаря, колонн, балок покрытия, прогонов, связей	03	100 т	0,65	§Е1-5, табл.2, п.5а,б	5,4	2,7	3-46	2-87	3,51	1,76	2-25	1-87	1,76	1-87
2. Укрупнение конструктивных элементов каркаса в рамы пролётом 18 м	02, 04	I констр. элемент	II	§Е5-1-3, табл.2, п.1,3к, К=1,1	0,20	0,04	0-16,8	0-04,6	2,2	0,44	1-85	0-51	0,44	0-51
			Добавлять на I т	34,3	п.2,4к, К=1,1	0,61	0,12	0-51,5	0-12,9	20,92	4,12	17-66	4-42	4,12
3. Укрупнение конструктивных элементов каркаса в полурамы пролётом 12 м	02, 04	I констр. элемент	II	§Е5-1-3, табл.2, п.1,3к, К=1,1	0,20	0,04	0-16,8	0-04,6	2,2	0,44	1-85	0-51	0,44	0-51
			Добавлять на I т	12,56	п.2,4к, К=1,1	0,61	0,12	0-51,5	0-12,9	7,66	1,51	6-47	1-62	1,51
4. Установка опорных столиков	02	I т	0,3	§Е5-1-18, табл.1, п.1а, К=1,1	36,3	-	27-04,9	-	10,89	-	8-12	-	-	-
5. Прихватка	05	I т	0,3	§Е5-1-18, табл.1, п.2а, К=1,1	4,51	-	3-56,4	-	1,35	-	1-07	-	-	-
6. Электросварка опорных столиков	05	10 м шва	0,62	§Е22-1-6, п.6,9г	3,3	-	3-00	-	2,05	-	1-86	-	-	-
7. Монтаж рам (пролёт 18 м)	02	I укруп. блок	II	§Е5-1-6, табл.2, п.1,3и, К=1,1	8,36	1,21	7-10,6	1-28,7	91,96	13,31	78-17	14-16	13,31	14-16
			Добавлять на I т	34,3	п.2,4и, К=1,1	0,96	0,13	0-81,4	0-14	32,93	4,46	27-92	4-80	4,46

Продолжение табл.4

Наименование процесса	Номер фасета для пересчета показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Зарботная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Зарботная плата с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
8. Монтаж подурам (пролёт 12 м)	02	I укрупн. блок	II	§Е5-1-6, табл.2, п.1,3и, N=1,1,	8,36	1,2I	7-10,6	1-28,7	91,96	13,3I	78-17	14-16	13,3I	14-16
			Добавлять на I т	12,56	п.2,4и, K=1,1	0,96	0,13	0-81,4	0-14	12,06	1,63	10-22	1-76	1,63
9. Монтаж вертикальных связей	02	I констр. элемент	18	§Е5-1-6, табл.2, п.1,3в, N=1,1	0,36	0,12	0-29	0-12,9	6,48	2,16	5-22	2-32	2,16	2-32
			Добавлять на I т	0,78	п.2,4в, K=1,1	1,65	0,55	1-32	0-58,3	1,29	0,43	1-03	0-46	0,43
10. Монтаж распорок	02	I констр. элемент	10	§Е5-1-6, табл.2, п.1,3б, K=1,1,	0,33	0,11	0-26,4	0-11,7	3,3	1,1	2-64	1-17	1,1	1-17
			Добавлять на I т	0,95	п.2,4б, K=1,1	1,1	0,36	0-88	0-38,5	1,05	0,34	0-84	0-37	0,34
11. Монтаж прогонов	02	I констр. элемент	130	§Е5-1-6, табл.2, п.1,3б, N=1,1,	0,33	0,11	0-26,4	0-11,7	42,9	14,3	34-32	15-21	14,3	15-21
			Добавлять на I т	14,4	п.2,4б, K=1,1	1,1	0,36	0-88	0-38,5	15,84	5,18	12-67	5-54	5,18
12. Монтаж горизонтальных связей	02	I констр. элемент	20	§Е5-1-6, табл.2, п.1,3в, K=1,1,	0,36	0,12	0-29,0	0-12,9	7,2	2,4	5-80	2-58	2,4	2-58
			Добавлять на I т	1,9	п.2,4в, N=1,1	1,65	0,55	1-32	0-58,3	3,14	1,05	2-51	1-11	1,05
13. Постановка болтов: с подмостей	02	I00 шт.	17,7	§Е5-1-19, п.1	11,5	-	8-57	-	203,55	-	151-69	-	-	-
			с земли	100 шт.	2,0	8,05	-	6-00	-	16,1	-	12-00	-	-

## Продолжение табл.4

Наименование процесса	Номер фасета для пересчёта показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Заработная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Заработная плата с учетом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
14. Установка лестницы	0I	I шт.	I	§ЕБ-1-2, п.8а,б, К=1,1	0,37	0,19	0-27,8	0-19,8	0,37	0,19	0-28	0-20	0,19	0-20
15. Перестановка лестницы	0I	I шт.	22	§ЕБ-1-2, (п.8а,б)х1,2, К=1,1	0,45	0,22	0-33,4	0-23,8	9,9	4,84	7-35	5-24	4,84	5-24
16. Снятие лестницы	0I	I шт.	I	§ЕБ-1-2, (п.8а,б)х0,8, К=1,1	0,30	0,15	0-22,2	0-15,4	0,30	0,15	0-22	0-15,4	0,15	0-15,4
Итого:									59I,II	73,12	472-18	78-16	73,12	78-16

## 4.2. Калькуляция № 2 на монтаж подкрановых балок, тормозных площадок, вертикальных связей

Таблица 5

Наименование процесса	Номер фасета для пересчёта показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Зарботная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Зарботн. плата с учётом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
1. Разгрузка с автотранспорта приспособлений, инвентаря, подкрановых балок, тормозных площадок, вертикальных связей, упоров	03	100 т	0,165	§Е1-5, табл. 2, п. 5а, б	5,4	2,7	3-46	2-87	0,89	0,45	0-57	0-47	0,45	0-47
2. Монтаж подкрановых балок	02	I констр. элемент	20	§Е5-1-9, п. 1в, г K=1,1	2,3	0,46	1-87	0-48,9	46,0	9,2	37-40	9-78	9,2	9-78
		Добавлять на I т	8,6	п. 2в, г K=1,1	0,53	0,11	0-42,7	0-11,7	4,56	0,95	3-67	1-01	0,95	1-01
3. Постановка болтов	-	100 шт.	3,16	§Е5-1-19, п. I	11,5	-	8-57	-	36,34	-	27-08	-	-	-
4. Общая выверка подкрановых балок	-	I констр. элемент	20	§Е5-1-9, п. 1д K=1,1	1,87	-	1-50,7	-	37,4	-	30-14	-	-	-
		Добавлять на I т	8,6	п. 2д K=1,1	0,84	-	0-67,5	-	7,22	-	5-81	-	-	-
5. Монтаж тормозных площадок	02	I т	1,51	§Е5-1-10, табл. I, п. 2а, в K=1,1	8,8	2,86	6-42,4	3-03,6	13,29	4,32	9-70	4-58	4,32	4-58
6. Постановка болтов	-	100 шт.	0,24	§Е5-1-19, п. I	11,5	-	8-57	-	2,76	-	2-06	-	-	-
7. Электросварка тормозных площадок	05	I т	1,51	§Е5-1-10, табл. I, п. 2б	2,2	-	1-74	-	3,32	-	2-63	-	-	-
8. Монтаж рельсов	02	I м рельсов	120,0	§Е5-1-13, (п. I, 2ж)х х0,7 K=1,1	0,36	0,09	0-30,2	0-06,5	43,20	10,80	36-24	7-80	10,80	7-80
9. Электросварка рельсов	05	10 м шва	6,0	§Е22-1-6, п. I, 4г	2,5	-	2-28	-	15,0	-	13-68	-	-	-

Продолжение табл.5

Наименование процесса	Номер фасета для пересчёта показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕНИР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Зарботная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Зарботная плата с учётом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
10. Монтаж вертикальных связей	02	I констр. элемент	4	§Е5-1-6, табл.2, п.1,3в, К=1,1	0,36	0,12	0-29,0	0-12,9	1,44	0,48	I-16	0-52	0,48	0-52
		Добавлять на I т	0,114	п.2,4в, К=1,1	1,65	0,55	1-32	0-58,3	0,19	0,06	0-15	0-07	0,06	0-07
11. Постановка болтов	-	100 шт.	0,48	§Е5-1-19, п.1	11,5	-	8-57	-	5,52	-	4-11	-	-	-
12. Монтаж упоров	02	I т	0,182	§Е5-1-18, табл.2, п.1,2д, К=1,1	4,84	2,42	3-60,8	2-56,3	0,88	0-44	0-66	0-47	0,44	0-47
13. Электросварка упоров	05	I м шва	0,52	§Е22-1-6, п.1,4г, К=1,1	2,5	-	2-28	-	1,30	-	I-19	-	-	-
14. Установка лестниц	01	I шт.	4	§Е5-1-2, п.8а,б, К=1,1	0,37	0,18	0-27,8	0-19,8	1,48	0,72	I-11	0-79	0,72	0-79
15. Перестановка лестниц	01	I шт.	20	§Е5-1-2 (п.8а,б)х1,2, К=1,1	0,45	0,22	0-33,4	0-23,8	9,00	4,4	6-68	4-76	4,4	4-76
16. Снятие лестниц	01	I шт.	4	§Е5-1-2 (п.8а,б)х0,8, К=1,1	0,30	0,15	0-22,3	0-15,8	1,20	0,60	0-89	0-63	0,60	0-63
Итого:									230,99	32,42	184-93	30-88	32,42	30-88

## 4.3. Калькуляция № 3 на монтаж ограждающих конструкций здания.

Таблица 6

Наименование процесса	Номер фасета для пересчета показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Зарботная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Зарботная плата с учётом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
1. Разгрузка с автотранспорта приспособлений, инвентаря, стеновых и кровельных панелей, угловых стоек, стоек фахверка	03	100 т	1,34	§Е1-5, табл. 2, п. 5а, б	5,4	2,7	3-46	2-87	7,24	3,62	4-64	3-85	3,62	3-85
2. Монтаж угловых стоек и стоек фахверка	02	I констр. элемент	12	§Е5-1-6, табл. 2, п. 1, 3в, К=1, I	1,01	0,35	0-84,5	0-37,3	12,12	4,20	10-14	4-48	4,20	4-48
		Добавлять на I т	2,9	п. 2, 4з, К=1, I	2,75	0,91	2-20	0-96,8	7,98	2,64	6-38	2-81	2,64	2-81
3. Постановка болтов: с подмостей с земли	-	100 шт.	0,24	§Е5-1-19, п. I	11,5	-	8-57	-	2,76	-	2-06	-	-	-
		100 шт.	0,24		8,05	-	6-00	-	1,93	-	1-44	-	-	-
4. Монтаж элементов фахверка	02	I констр. элемент	86	§Е5-1-6, табл. 2, п. 1, 3б, К=1, I	0,33	0,11	0-26,4	0-11,7	28,38	9-46	22-70	10-06	9,46	10-06
		Добавлять на I т	6,07	п. 2, 4б, К=1, I	1,1	0,36	0-88	0-38,5	6,68	2,19	5-34	2-34	2,19	2-34
5. Постановка болтов: с подмостей с земли	-	100 шт.	2,56	§Е5-1-19, п. I	11,5	-	8-57	-	29,44	-	21-94	-	-	-
		100 шт.	0,64		8,05	-	6-00	-	5,15	-	3-84	-	-	-
6. Монтаж стоек ворот	02	I констр. элемент	8	§Е5-1-6, табл. 2, п. 1, 3з, К=1, I	1,06	0,35	0-84,5	0-37,3	8,48	2,80	6-76	2-98	2,80	2-98
		Добавлять на I т	0,86	п. 2, 4з, К=1, I	2,75	0,91	2-20	0-96,8	2,37	0,78	1-89	0-83	0,78	0-83

Продолжение табл.6

Наименование процесса	Номер фасета для пересчета показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕИИР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Заработная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Заработная плата с учётом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
7. Постановка болтов: с подмостей	-	100 шт.	0,16	§Е5-1-19, п.1	11,5	-	8-57	-	1,84	-	1-37	-	-	-
с земли	-	100 шт.	0,16		8,05	-	6-00	-	1,29	-	0-96	-	-	-
8. Сборка кровельных панелей в картины на стенде	04	100 м <sup>2</sup> настила кровли	14,4	§Е5-1-20, табл.1, п.3	5,8	-	4-28	-	83,52	-	61-63	-	-	-
9. Установка лестниц	01	1 шт.	4	§Е5-1-2, п.8а,б, К=1,1	0,37	0,19	0-27,8	0-19,8	1,48	0,76	1-11	0-79	0,76	0-79
10. Перестановка лестниц	01	1 шт.	72	§Е5-1-2, (п.8а,б)х х1,2, К=1,1	0,45	0,22	0-33,4	0-23,8	32,40	15,84	24-05	17-14	15,84	17-14
11. Снятие лестниц	01	1 шт.	4	§Е5-1-2, (п.8а,б)х х0,8, К=1,1	0,30	0,15	0-22,3	0-15,8	1,2	0,60	0-89	0-63	0,60	0-63
12. Подъём картин на кровлю	03	На каждый метр подъёма 100 м <sup>2</sup> настила кровли	144	§Е5-1-20, табл.5, п.14, К=1,1	0,05	0,017	0-04,3	0-01,8	7,20	2,45	6-19	2-59	2,45	2-59
13. Укладка на кровлю картин краном	02	100 м <sup>2</sup>	14,4	то же, п.15, К=1,1	2,2	0,55	1-71	0-58	31,68	7,92	24-62	8-35	7,92	8-35
14. Установка картин	-	100 м <sup>2</sup>	14,4	§Е5-1-20, табл.1, п.4в	6,2	-	4-71	-	89,28	-	67-82	-	-	-
15. Подъём краном кровельных панелей в пачке на кровлю	03	100 м <sup>2</sup>	3,6	§Е5-1-20, табл.5, п.9, К=1,1	0,11	0,03	0-08,3	0-03,5	0,40	0,11	0-30	0-13	0,11	0-13



Продолжение табл.6

Наименование процесса	Номер фасета для пересчёта показателей	Единица измерения	Объём работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Зарботная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Зарботная плата с учётом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
16. Установка кровельных панелей	-	100 м <sup>2</sup>	3,6	§Е5-1-20, табл.1, п.1в	10,5	-	7-90	-	37,80	-	28-44	-	-	-
17. Заделка стыков прокладками из минеральной ваты	05	м <sup>2</sup>	27	§Е11-17, п.2а применительно	0,12	-	0-07,2	-	3,24	-	1-94	-	-	-
18. Установка лестниц	01	1 шт.	2	§Е5-1-2, п.8а,б, К=1,1	0,37	0,19	0-27,8	0-19,8	0,74	0,38	0-56	0-40	0,38	0-40
19. Перестановка лестниц	01	1 шт.	114	§Е5-1-2 (п.8а,б)хх1,2, К=1,1	0,45	0,22	0-33,4	0-23,8	51,30	25,08	38-08	27-13	25,08	27-13
20. Снятие лестниц	01	1 шт.	2	§Е5-1-2 (п.8а,б)хх0,8	0,30	0,15	0-22,3	0-15,8	0,60	0,30	0-45	0-32	0,30	0-32
21. Монтаж трехслойных стеновых панелей	02	1 панель	94	Типовой Сборник, §Т-7-65	2,3	0,38	1-33	0-26,7	216,20	35,72	125-02	25-10	35,72	25-10
22. Установка железобетонных стеновых панелей	02	1 панель	26	§Е4-1-8, табл.2, п.9, К=1,1	1,54	0,39	1-16,6	0-40,8	40,04	10,14	30-32	10-61	10,14	10-61
23. Монтаж оконных переплётов	02	1 т	7,1	§Е5-1-15, табл.2, п.7,8, К=1,1	4,73	1,54	3-78,4	1-62,8	33,58	10,93	26-87	11-56	10,93	11-56
24. Электросварка оконных переплётов	05	1 т	7,1	§Е5-1-15, табл.2, п.9	0,57	-	0-45	-	4,05	-	3-20	-	-	-
25. Установка ворот	02	1 т	3,28	§Е5-1-15, табл.2, п.7,8 применительно, К=1,1	4,73	1,54	3-78,4	1-62,8	15,51	5,05	12-41	5-34	5,05	5-34
26. Электросварка ворот	05	1 т	3,28	§Е5-1-15, табл.2, п.9 применительно	0,57	-	0-45	-	1,87	-	1-48	-	-	-

Продолжение табл.6

Наименование процесса	Номер фасета для пересчёта показателей	Ед. изм.	Объём работ	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Нормы времени		Расценка, р.-к.		Затраты труда		Заработная плата, р.-к.		Время пребывания машины на объекте, маш.-ч	Заработная плата с учётом пребывания машины на объекте, р.-к.
					рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста	рабочих, чел.-ч	машиниста, чел.-ч (маш.-ч)	рабочих	машиниста		
27. Установка передвижных подмостей	0I	I шт.	2	§Е5-1-2, п.2а	0,5I	-	0-38	-	1,02	-	0-76	-	-	-
28. Перестановка передвижных подмостей	0I	I шт.	56	§Е5-1-2, п.2а x 1,2	0,6I	-	0-46	-	34,16	-	25-76	-	-	-
Итого:									802,93	140,97	571-36	137-44	140,97	137-44
В С Е Г О по калькуляциям № 1,2,3									1625,03	246,5I	1228-47	246-48	246,5I	246-48



## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Продолжение табл. 8

## 6.1. Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях.

Таблица 8

Наименование	Марка, техническая характеристика, НТД, № чертежа	Кол-во, шт.	Назначение
Строп четырех-ветвевой	4СК1-3, 2/5000 ГОСТ 25573-82*	1	Подъём цокольных стеновых панелей, панелей покрытия
Строп двух-петлевой	СКП1-1, 25/1500 ГОСТ 25573-82*	4	Подъём подкрановых балок
То же	СКП1-2, 5/10200 ГОСТ 25573-82*	4	Подъём рам каркаса, стеновых панелей
То же	СКП1-0, 32/7160 ГОСТ 25573-82*	2	Подъём стеновых панелей
Пружинный замок	ПР-3, 2; ВНИПИ Промсталь-конструкция Минмонтажспецстроя СССР проект 29700-100	2	Дистанционная расстроповка конструкций
Захват	ТТК, шифр 6547030004, л. 33	1	Подъём кровельной панели ПКМ-120
Траверса	ТТК шифр 6547030004, л. 33 или проект 009.00.000 ЦНИИОМТП Госстроя СССР	2	Подъём укрупненных блоков покрытия
Расчалка из каната	13-Г-1-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80*, L <sub>к</sub> =14830 мм	2	Временное крепление первой рамы каркаса
То же	13-Г-1-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80*, L <sub>к</sub> =9580 мм	2	То же
Инвентарная распорка	ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР проект 4234Р-44	1	Временное крепление рам каркаса
Рожковый зажим	16-1 ОСТ 24.090.51-86	24	Временное крепление петли каната
Талреп	1, 6, I, ВУ ГОСТ 19191-73*	4	Натяжение каната расчалки
Скоба такелажная	Сп-1, 6, ГОСТ 25573-82*	8	Строповка каната
Канат бельный	φ II мм L=5000 мм ГОСТ 483-75*	2	Оттяжка конструкций при монтаже

Наименование	Марка, техническая характеристика, НТД, № чертежа	Кол-во, шт.	Назначение
Подкладка под канат	ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР проект 29700-106-00	4	Установка под канат в местах перегиба стропа при обхвате поднимаемой конструкции
Склад-пирамида для стеновых панелей	Трест Мосоргтехстрой Главмосстроя, проект 3942.10А	4	Складирование цокольных стеновых панелей
Приставная лестница	Высота 4890 мм ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР	2	Монтаж подкрановых балок
Приставная лестница	ЛА-4 ВЗСАК им. Ф. Б. Якубовского	2	Монтаж рам каркаса, панели покрытия
Лестница с монтажной площадкой	ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР, проект 52708М-202	2	Монтаж стеновых панелей
Лестница	ЛА-1 ВНИПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР, проект 15058	2	То же
Площадка передвижная	ЦНИИОМТП Госстроя СССР, проект 770.09.000	2	Организация рабочего места монтажника при монтаже стеновых панелей
Подмости облегченные	ЦНИИОМТП Госстроя СССР, проект 4401.00.000	2	То же
Трансформатор сварочный	ТД-500 ГОСТ 95-77*Е	1	Питание переменным током при ручной дуговой сварке
Преобразователь частоты тока	ИЭ-9401А	1	Преобразование переменного тока напряжением 380/220 В в ток напряжением 36 В

6547030004

Лист

50

Продолжение табл.8

Наименование	Марка, техническая характеристика, НТД, № чертежа	Кол-во, шт.	Назначение
Штепсельное соединение	ИЭ-9902	2	Подключение электроинструмента к питающей электросети
Машина ручная сверлильная электрическая (с набором сверл)	ИЭ-1026Б или ИЭ-1035	2	Сверление отверстий под самонарезные винты и комбинированные заклёпки
Гайковёрт ручной электрический	ИЭ-3И14Б или ИЭ-3И13А	2	Установка самонарезающих винтов
Электрододержатель	ГОСТ 14651-78*Е	1	Сварка конструкций
Пенал для электродов	ЦНИИОМТП, проект 3.294.71.000	2	Хранение и транспортирование электродов
Насадка-выборка	Трест Уралстальконструкция ТСО Стальконструкция Минмонтажспецстрой СССР, проект 19р-1	2	Сверление отверстий в теплоизоляционном слое
Насадка магнитная	То же, проект 19р-2	2	Применяется с гайковёртом в качестве удлинителя
Ящик инструментальный	ЯМД ТУ 36-1037-75	2	Хранение и переноска мелкого инструмента и крепежных изделий
Приспособление для хранения комбинированных заклёпок	Индивидуального изготовления	2	Хранение комбинированных заклёпок на рабочем месте в удобном положении для захвата заклёпочником
Пистолет ручной односторонней клёпки	СТД-96/1, Ногинский опытный завод монтажных приспособлений Минмонтажспецстрой СССР, проект 4610-00-00	2	Установка комбинированных заклёпок
Нормокомплект для сварочных работ	ПКТИ ТСО "Джуралстрой", проект 712.00.000А	1	Для сварочных работ
Лом монтажный	ЛМА (ЛМВ) ГОСТ 1405-83	2	Рихтовка элементов

Продолжение табл.8

Наименование	Марка, техническая характеристика, НТД, № чертежа	Кол-во, шт.	Назначение
Кувалда	ГОСТ 11402-75*	1	Выпрямление конструкций
Рулетка	РС-1, ГОСТ 7502-80*	1	Измерение элементов и разбивка осей
Линейка измерительная металлическая	ГОСТ 427-75*	1	То же
Нивелир в комплекте	Н-3, ГОСТ 10528-76*	1	Выполнение геодезических работ
Теодолит в комплекте	Т1, ГОСТ 10529-86	2	То же
Пояс предохранительный	ГОСТ 12.4.089-86	2	Для защиты от падения с высоты
Каска строительная	ГОСТ 12.4.087-84	7	Индивидуальное средство защиты
Обувь диэлектрическая	ГОСТ 13385-78*	2	Электробезопасность
Щуп металлический	ТУ 2-034-225-87	2	Контроль натяжения болтов

6.2. Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ,

Таблица 9

Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ)	Вариант (фасет-код)	Исходные данные			Потребность в материале
		Единица измерения	Объем работ в нормативных единицах	Принятая норма расхода материала	
Электроды Э-42	-	т	216	17 кг	3672 кг
Прочие материалы	-	т	216	2,78 руб	600 руб.

## 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

До начала работ все члены бригады должны быть проинструктированы о правильных приемах труда и правилах техники безопасности. Получив инструктаж, расписываются в специальных журналах.

В процессе производства строительно-монтажных работ присутствуют следующие опасные факторы:

- падение работающих с высоты;
- поражение электрическим током;
- поражение от падения груза.

Для предупреждения этих опасных факторов необходимо применять средства индивидуальной защиты работающих.

Основным средством индивидуальной защиты работающих от падения с высоты является предохранительный пояс. Все работы на высоте 1,3 м и более, а также на участках, расположенных на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, выполнять с предохранительными поясами (при невозможности устройства ограждений).

Для защиты электросварщиков от поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие требования:

для защиты рук электросварщика должны обеспечиваться рукавицами или перчатками, изготовленными из искростойких материалов с низкой электропроводностью;

для защиты ног должна применяться специальная обувь, предохраняющая ноги от ожогов брызгами расплавленного металла, а также от

механических травм;

для защиты головы от механических травм и поражения электрическим током должны выдаваться защитные каски из токонепроводящих материалов; для защиты лица и глаз электросварщика должны обеспечиваться защитными щитками, масками, защитными очками и светофильтрами.

Для предупреждения поражения работающих от падения груза все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски (ГОСТ 12.4.087-84). Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

До выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом крана. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

При гололедице, сильном снегопаде, тумане, грозе и дожде монтажные работы прекращаются.

Не допускается также производить монтажные работы при скорости ветра 15 м/с и более. Монтаж панелей с большой парусностью следует прекращать при скорости ветра 10 м/с.

Одним из важных мероприятий предупреждения производственного травматизма является тщательная подготовка строительных конструкций к подъёму на высоту для установки в проектное положение.

Перед началом монтажа конструкцию тщательно осматривают, геометрические размеры проверяют с помощью стальной рулетки и выявленные дефекты устраняют на месте складирования или непосредственного монтажа.

Перед началом подъёма проверяют правильность и надёжность строповки конструкции и к ней прикрепляют гибкие канаты для дистанционной расстроповки, гибкие оттяжки для предотвращения раскачивания и вращения ее в процессе подъёма и установки, а также (при необходимости) устройства (расчалки из стальных канатов, распорки и т.п.), обеспечивающие устойчивость после расстроповки.

Расстроповку конструкций, установленных в проектное положение, производят только после временного или постоянного надёжного их закрепления по проекту болтами, пробками, электроприхваткой с установкой связей, распорок, расчалок и т.д.

Расчалки для временного закрепления конструкции изготавливают из стального каната одинакового диаметра в каждой паре и располагают с углами наклона и к горизонту, и к плоскости расчаливания (в горизонтальной плоскости) не более 45°.

Расчалки прикрепляют к специальным якорям или конструкциям способами, исключающими ослабление натяжения, и располагают за пределами движения транспорта и монтажных механизмов.

При отсутствии специальных указаний в проекте расстроповку конструктивных элементов, соединяемых болтами, осуществляют только после установки в узле не менее 30 % болтов и 10 % пробок, в случаях, когда общее их число в узле более 5; при 5 и менее - должен быть установлен не менее чем один болт и одна пробка.

В процессе выполнения сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием специального инструмента (конусных оправок, сборочных пробок). Проверять совпадение отверстий в монтируемых деталях пальцами рук не допускается.

Расстроповку конструктивных элементов, соединяемых электро-сваркой, воспринимающих монтажные нагрузки, осуществляют только после заварки узлов соединений проектными сварными швами или прихваткой, размеры которых определяют проектом, а расстроповку конструкций, не воспринимающих монтажные нагрузки, - после выполнения прихваток, длина которых должна быть не менее 10 % длины проектных монтажных швов данного соединения, но не короче 50 мм; до расстроповки в дополнение к указанным должны быть установлены временные или постоянные связи, распорки и расчалки.

Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом не допускается. Электросварочные работы выполнять согласно требованиям ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные".

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП Ш-4-80\*, "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором в 1969 г. и ГОСТ 12.1.013-78 "Строительство. Электробезопасность".

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗДАНИЕ

Нормативные затраты труда монтажников, чел.-ч	1625,03
Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч	246,51
Заработная плата монтажников, р.-к.	1228-47
Заработная плата механизаторов, р.-к.	246-48
Продолжительность выполнения работ, смена	39,54
Выработка одного рабочего, т/чел.-смену	1,06
Условные затраты на механизацию базового варианта, р.-к.	1639-29
Сумма изменяемых затрат, р.-к.	2867-76

## 9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

## ФАСЕТ 01

Стоимость I маш.-ч (чел.-ч) использования средств подмазывания, р.-к.

Наименование фактора	Обоснование	Код	Значение фактора
Передвижные подмости	По калькуляции	1	0-75
Автоподъёмник АП-17	СНиП IУ-3-82, Приложение. Сб. сметных цен	2	4-45
Лестница приставная	По калькуляции	3	0-4I

## ФАСЕТ 02

Стоимость I маш.-ч работы монтажного крана, р.-к.

Наименование фактора	Обоснование	Код	Значение фактора
Кран пневмоколёсный грузоподъёмностью 16 т	СНиП IУ-3-82, Приложение. Сб. сметных цен	1	6-65
Кран автомобильный грузоподъёмностью 16 т	То же	2	4-63
Кран гусеничный грузоподъёмностью 25 т	"-	3	6-39
Кран пневмоколёсный грузоподъёмностью 25 т	"-	4	6-9I

## ФАСЕТ 03

Условия производства работ

Наименование фактора	Обоснование	Код	Значение фактора
Вредные при сварочных работах	ЕНиР, Общая часть, п. 5, §Е22-I-6, п. 6г, 9г	1	По калькуляции
Вредные при изоляционных работах	ЕНиР, Общая часть, п. 5, §Е11-4I	2	Н.вр. и Расц. умножать на 0,6



## СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

1. Область применения	I
2. Организация и технология выполнения работ	2
2.1. Общие положения	2
2.2. Технологическая последовательность выполнения работ на ячейке	4
2.3. Геодезическое обеспечение	9
2.4. Указания по производству работ в зимнее время	10
3. Требования к качеству и приёмке работ	II
4. Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы	40
4.1. Калькуляция № 1 на монтаж элементов каркаса здания	40
4.2. Калькуляция № 2 на монтаж подкрановых балок, тормозных площадок, вертикальных связей	43
4.3. Калькуляция № 3 на монтаж ограждающих конструкций здания	45
5. График производства работ на монтаж здания	49
6. Материально-технические ресурсы	50
6.1. Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях	50
6.2. Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ	52
7. Техника безопасности	52
8. Техничко-экономические показатели на здание	53
9. Фасетный классификатор факторов	54

**РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  
И ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГТЕХСТРОЕВ,  
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ, ЗАВОДОВ  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДРУГИХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ, ДИРЕКТОРАМ  
СТРОИТЕЛЬНО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**

Типовые технологические карты (ТТК) на производство отдельных видов работ являются неотъемлемой частью проектов производства работ, используются в качестве основы при их разработке или входят в них как самостоятельные части

ТТК способствуют повышению производительности труда строителей, сокращению сроков и повышению качества строительства

В предлагаемую ниже Вашему вниманию таблицу, включены все разделы и подразделы, входящие в Перечень типовых технологических карт на производство отдельных видов работ<sup>1</sup>, приобрести который Вы можете наложенным платежом, прислав заказ в адрес отдела научно-технической информации ЦНИИОМТП Госстроя СССР

В каждом разделе этого Перечня представлено до 100 наименований ТТК. Выбрав интересующие Вас карты, необходимо направить заказ на их приобретение в тот же адрес

Адрес, по которому следует присылать заказы на приобретение Перечня или отдельных ТТК: 103012, г Москва, ул Куйбышева, 3/8 ОНТИ ЦНИИОМТП Госстроя СССР

Справки по телефонам 928-89-24, 923-99-10

Код (по классиф.  
ЦНИИОМТП)

РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ ПЕРЕЧНЯ

*Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ И БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ*

11000	Вертикальная планировка
12000	Разработка котлована
13000	Разработка траншей
14000	Обратная засыпка и уплотнение грунта
15000	Возведение дамб, плотин, насыпей

*Раздел 2. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ И ИСКУССТВЕННОЕ  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ*

21000	Погружение свай
22000	Устройство буронабивных свай
24000	Закрепление грунтов

*Раздел 3. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ  
(МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН)*

31000	Бетонные работы
32000	Арматурные работы
33000	Опалубочные работы

*Раздел 4. МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ*

41000	Монтаж сборных железобетонных конструкций
42000	Монтаж металлических конструкций
43000	Монтаж деревянных, пластмассовых и других конструкций

*Раздел 5. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ*

51000	Каменная и кирпичная кладка
52000	Кладка из бетонных и керамических камней, гипсовых плит и стеклоблоков

Код (по классиф.  
ЦНИИОМТП)

РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ ПЕРЕЧНЯ

*Раздел 6 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*

61000	Подготовительные работы
62000	Устройство пароизоляции
63000	Устройство теплоизоляции
64000	Устройство стяжек
65000	Устройство гидроизоляционного слоя покрытия
66000	Устройство защитного слоя
67000	Гидроизоляция конструкций зданий и сооружений

*Раздел 7 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*

71000	Облицовочные работы
72000	Штукатурные работы
73000	Столярные работы
74000	Малярные работы
75000	Стекольные работы
76000	Обойные работы
77000	Устройство подвесных потолков
78000	Устройство полов

*Раздел 8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*

81000	Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации
82000	Работы по установке оборудования систем отопления
84000	Работы по устройству систем вентиляции
85000	Работы по устройству наружных сетей водоснабжения
86000	Работы по устройству сетей канализации
87000	Работы по устройству сетей теплоснабжения
810000	Работы по устройству автодорог
814000	Монтаж и демонтаж мобильных (инвентарных) зданий
815000	Монтаж технологического оборудования

ТИПОВАЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6547030004  
814004

МОНТАЖ ЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛМК КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ  
РАЗМЕРОМ (18+12)х60 м С КАРКАСОМ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ  
(ПРОЕКТ 236-01 В1)

---

Подписано к печати 1.07.1991 г.	Формат 60х90/8
Объем 7,5 печ.л.	Тираж 300 экз.
	Заказ № 1252

---

МПН "ФОТОТИП" г. Москва

ЦНИИОМШ Госстроя СССР

103012, Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8

Тел. 928-89-24, 923-99-10
